Z M L U V A O D I E L O
č. 20210512

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
medzi

Objednávateľ:	**OBEC KUZMICE**
So sídlom:	Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO:	00331643
DIČ:	2020773458
bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	SK02 5200 0000 0000 1317 4851
štatutárny orgán:	**Ing. Martin Vincej**, starosta obce

(ďalej len „**objednávateľ**“)
„na jednej strane“

a

Zhotoviteľ:	**NOVICOM s.r.o.**
so sídlom	Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO	36591891
DIČ	2022001465
IČ DPH	SK2022001465
bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu	SK84 0900 0000 0005 5256 2677

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v oddiele Sro, vo vložke č. 16420/V
v mene spoločnosti koná **Ing. Peter Novák,** konateľ spoločnosti
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

Preambula

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve.
2. Na účely tejto zmluvy a jej príloh sa pod pojmom:
   a) „dielo“ rozumie dielo špecifikované v článku 1 tejto zmluvy
   b) „rozpočet stavby“ rozumie rozpočet stavby „“ v príslušnom rozsahu, špecifikácií a požiadaviek na technické parametre.
3. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania zadávania zákazky na predmet zákazky: „**Výstavba materskej školy v obci Kuzmice“** zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej ako podlimitnej zákazky podľa § 112 a násl. zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov vo Vestníku VO 81/2021 dňa 06.04.2021 č. ozn. 17422-WYP uzatvárajú túto Zmluvu o dielo.

1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby:
názov stavby: **Výstavba materskej školy v obci Kuzmice**
miesto stavby: **Kuzmice**
stavebník: **Obec Kuzmice (objednávateľ),**

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo, realizovať všetky stavebné práce súvisiace a nevyhnutné na riadne splnenie diela a všetky úkony s tým súvisiace a to podľa podkladov

špecifikovaných v bode 1.3 tohto článku zmluvy (ďalej len „dielo“) a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvy.

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo (ďalej len „Dielo“):

1.3.1. Podľa projektovej dokumentácie a podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania verejného obstarávania,

1.3.2. podľa oceneného výkazu výmer prác, ktorý bol súčasťou ponuky Zhotoviteľa a ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako **príloha č. 1** (ďalej len „rozpočet - **ocenený výkaz výmer**“);

1.3.3. podľa schváleného vecného a časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len: „**harmonogram**“), ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako **príloha č. 2.**

1.4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že bol podrobne oboznámený s dokumentmi podľa bodu 1.3 tohto článku zmluvy a zaväzuje sa realizovať dielo a všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v súlade s týmito podkladmi. V prípade vzniku akejkoľvek škody objednávateľovi z dôvodu realizácie diela v rozpore s podkladmi podľa bodu 1.3 tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje nahradiť objednávateľovi preukázateľnú vzniknutú škodu v celom rozsahu.

1.5. Dokumenty podľa bodu 1.3 tohto článku zmluvy sú záväznými podkladmi pre výklad a plnenie všetkých povinností podľa tejto zmluvy.

1.6. Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne.

2. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

2.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade:

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,
c) s touto zmluvou,
d) s projektovou dokumentáciou diela,
e) s oceneným výkazom výmer,
f) s harmonogramom.

2.2. Akákoľvek dokumentácia vyhotovená, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

2.3. Pred začatím vykonávanie diela sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady vypracovať a odovzdať objednávateľovi:

2.3.1. vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku; zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie týchto vedení a sietí počas vykonávania diela, ak je to potrebné,

2.3.2. potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravných značiek a ostatného dopravného značenia na základe súhlasu dotknutých orgánov verejnej správy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä na úseku premávky na pozemných komunikáciách, a tieto dopravné značky a ostatné dopravné značenie udržiavať počas celej doby vykonávania diela na svoje náklady, ak je to potrebné.

2.4. Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo podľa tejto zmluvy užívať na účel, na ktorý je určené, dielo je vykonané bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom, a miesto vykonávania diela je vypratané a čisté.

2.5. **Čas vykonania diela.** Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky (dielo) zrealizovať v lehote **najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska** (na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska) pričom je povinný dodržiavať harmonogram vykonávania diela.

2.6. **Miesto vykonávania diela.** Miestom vykonávania diela podľa tejto zmluvy je **Obec Kuzmice (parcela č. 645/1 kú. Kuzmice).**

2.7. **Stavenisko.** Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu objednávateľa, pričom objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska aspoň tri (3) pracovné dni vopred.
Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 10 dní na základe písomnej výzvy objednávateľa voči zhotoviteľovi kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby zhotoviteľ dielo zhotovil v lehote plnenia podľa tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu v ktorom uvedú najmä:
- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
- iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiada objednávateľ alebo zhotoviteľ,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

2.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady:
- vybudovanie staveniska, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska,
- stráženie staveniska ak je to potrebné; na stavenisko môžu vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední zamestnanci a spolupracujúce osoby objednávateľa a kontrolné orgány verejnej správy,
- osvetlenie staveniska ak je to potrebné,
- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach a odstraňovanie odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní diela,
- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na stavenisku,
- skládky stavebných odpadov a sute,
- všetky povolenia a iné rozhodnutia orgánov verejnej správy potrebné k dočasnému užívaniu verejných a ostatných plôch za účelom vykonávania diela, vrátane správnych poplatkov a sankcií spojených s užívaním týchto plôch v rozpore s povoleniami a/alebo inými rozhodnutiami, resp. uložených v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa s vykonávaním diela,
- dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu diela,
- vykonávanie všetkých skúšok a kontrol v rozsahu podľa skúšobného plánu ak je to potrebné,
- vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela,
- účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na pracovných poradách a pri kontrole všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného dielo od projektovej dokumentácie zistených pri kontrolách a pracovných poradách počas vykonávania diela,
- súčinnosť projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom autorského dozoru pri kontrole vykonávanie diela.

2.9. Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať celé dielo pred dohodnutou lehotou, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Preberanie jednotlivých častí diela za účelom postupného platenia ceny za dielo nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela.

2.10. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela.

2.11. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.

2.12. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela, ktorá bola predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatím a odovzdaním diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávateľa.

2.13. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k zariadeniam, dielom a materiálom dodaných zhotoviteľom v rámci vykonaného diela a k podkladovým materiálom k dielu, ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela objednávateľovi.

2.14. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

2.15. **Stavebný denník.** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „**zápisy**“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:
   - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
   - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
   - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
   - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy stavebný dozor objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len odborný dozor objednávateľa.

2.16. **Zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu**/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zmluvy a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

2.16.1. Oprávnenými osobami na výkon auditu:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

3.1. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „**BOZP**“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „**PO**“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „**pracovisko**“ alebo aj „**stavenisko**“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „**ŽP**“). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí.

3.2. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.

3.3. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „**zamestnanci**“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.

3.5. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela subdodávateľovi iba v rozsahu uvedenom **v zozname subdodávateľov,** ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

3.6. V prípade, že sa obe zmluvné strany dohodnú na zmene subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, každý subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienku oprávnenosti uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

3.7. **Objednávateľ určuje pravidlo na zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**
- V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľa podľa ods. 3.5 tohto článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:
  - údaje o novom subdodávateľovi (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo) a údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
  - informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke
  - čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa, že nový subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky oprávnenosti uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.

3.8. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi.

3.9. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe nového subdodávateľa a čestného vyhlásenia, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácii.

3.10. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu nového subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným novým subdodávateľom príslušnú zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečované plnenie tejto Zmluvy.

3.11. Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.

3.12. Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku.

3.13. Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.

3.14. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu objednávateľovi.

3.15. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave.

3.16. V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „**OH**“) tak, aby bol naplnený jeho účel.

3.17. Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Zhotoviteľ zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a toto zaradenie a predpokladané množstvo odpadu oznámi objednávateľovi, zhromaždí odpad oddelene podľa druhov odpadov a zabezpečí ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a odpad zhodnotí, ponúkne na zhodnotenie oprávnenej osobe, zneškodní alebo zabezpečí jeho zneškodnenie oprávnenou osobou.

3.18. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní od dňa doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie zamestnancov, predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy.

3.19. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

3.20. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje okrem vykonania zápisu v stavebnom denníku vyzvať aj písomne objednávateľa, resp. jeho zástupcu, na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie týchto prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených, pokiaľ sa nezistí vadné vykonanie odkrytých prác. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady; táto fotodokumentácia tvorí súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

4.2. O odovzdaní a prevzatí diela na účely platenia ceny za dielo spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanej časti diela, použitých stavebných výrobkoch a materiáloch, odovzdaní a prevzatí časti diela, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa časti diela a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád časti diela, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta k zisteným vadám, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany, v prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám, nedohodnú na lehote odstránenia týchto vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.

4.3. O odovzdaní a prevzatí celého diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanom diele, použitých stavebných výrobkoch a materiáloch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád diela, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta k zisteným vadám, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany, v prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám, nedohodnú na lehote odstránenia týchto vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.

4.4. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo ak je vykonané vadne, ak však prevezme vadne vykonané dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v písomnom protokole zmluvné strany nedohodnú inak.

4.5. V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie a po uplynutí tejto lehoty objednávateľ neprevezme dielo ani v náhradnej zhotoviteľom určenej a objednávateľovi písomne oznámenej lehote, ktorá nesmie byť krajšia ako päť (5) pracovných dní, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje.

5. CENA ZA DIELO

5.1. Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovite oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo:

Cena celkom v Eur bez DPH:	**475 224,96**
Sadzba DPH (%):	**20**
Výška DPH v Eur:	**95 044,99**
Cena celkom v Eur s DPH:	**570 269,95**

Takto stanovená cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z projektovej dokumentácie a ocenených výkazov výmer, jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov a podľa ustanovení tejto zmluvy a bude sa aplikovať počas celej doby vykonávania diela.

5.2. V cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt ako aj v cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela podľa tejto zmluvy najmä:

5.2.1. náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska,

5.2.2. náklady spojené so zabezpečením plnenia povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP

5.2.3. náklady na energie a média spotrebované pri vykonávaní diela,

5.2.4. mzdové náklady podľa platných predpisov,,

5.2.5. náklady spojené s plnením povinnosti zhotoviteľa vo vzťahu k skúšobnému plánu a s odovzdaním a prevzatím diela,

5.2.6. náklady na vytýčenie podzemných sietí,

5.2.7. náklady na dočasné dopravné značenie (ak sa uplatňuje)

5.2.8. náklady poistenia podľa tejto zmluvy.

5.3. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela.

5.4. **K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:**

5.4.1. v prípade naviac prác, menej prác alebo pri zmene technického riešenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom za podmienky, že táto potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou nedochádza k podstatnej zmene predmetu Zmluvy,

5.4.2. pri zmene zákonnej sadzby DPH,

5.4.3. pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,

5.5. Ostatné zmeny zmluvnej ceny nie sú prípustné.

5.6. Zmluvná strany sa dohodli, že zhotoviteľ pri oceňovaní naviac práce bude postupovať nasledovne:

5.6.1. položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v Prílohe č. 1 – rozpočet Zmluvy, musia byť ocenené podľa tohto rozpočtu,

5.6.2. položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v Prílohe č. 1 – rozpočet, budú ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri ocenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.

5.7. Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz výmer prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie ocenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.

5.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.

5.9. V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v Prílohe č. 1 – rozpočet, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

5.10. Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (ust. § 18) a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Na základe dohody zmluvných strán dohodnutú zmluvnú cenu za uskutočnené práce uhradí Objednávateľ zhotoviteľovi bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku na základe predloženej faktúry za preukázateľne uskutočnené práce po ich vykonaní, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a jej prílohou musí byť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí prác a kópia stavebného denníka preukazujúca vykonanie fakturovaných výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, prác, dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt podľa oceneného výkazu výmer potvrdený zástupcom objednávateľa. **Splatnosť predloženej faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.**

6.2. V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený:

6.2.1. faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo

6.2.2. faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti.

6.2.3. V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.

6.3. Dňom zaplatenia platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany.

6.4. V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo.

6.5. Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania.

6.6. V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

6.7. **Objednávateľ zadrží sumu vo výške 10% z celkovej fakturovanej sumy ako zábezpeku na svoje prípadné nároky zo zodpovednosti za vady diela,** ktorú vyplatí zhotoviteľovi vo výške 50% zadržanej sumy po uplynutí dvadsiatich štyroch (24) mesiacov zo záručnej doby a zvyšok zadržanej sumy po uplynutí celej záručnej doby. Objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi zadržanú sumu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku kedykoľvek počas plynutia záručnej doby ihneď potom, čo zhotoviteľ preukáže objednávateľovi, že zabezpečil svoj záväzok zo zodpovednosti za vady diela bankovou zárukou.

6.8. **Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoj záväzok zo zodpovednosti za vady diela bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 10% z ceny za dielo** podľa článku 5 tejto zmluvy, ktorá musí byť vystavená najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom podľa tejto zmluvy na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Banková záruka musí byť vystavená tuzemskou bankou a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka nesmie obsahovať zákaz odstúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky.

6.9. Verejná zákazka bude financovaná formou nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje a vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.

6.10. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.

6.11. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi v súlade s bodom 6.1 tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 6.1 tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny zhotoviteľovi.

6.12. **Fakturácia sa bude uskutočňovať čiastkovou fakturáciou, maximálne 3 faktúry, z toho 1 bude záverečná - konečná faktúra.**

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. **Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo** podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.2. Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby:

7.2.1. dielo bude vykonané presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,

7.2.2. použité stavebné výrobky, materiály, hmoty a zariadenia budú najvyššej kvality a bezvadné,

7.2.3. dielo po jeho vykonaní bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou,

7.2.4. objednávateľ získa vlastnícke právo k zariadeniam, výrobkom a materiálom dodaných zhotoviteľom v rámci vykonaného diela, neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami práv k predmetom duševného vlastníctva.

7.3. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady vykonaného diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

7.4. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady na náklady zhotoviteľa.

7.5. V súlade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo za vadne vykonanú opravu alebo jej časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vady a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA, ZMLUVNÉ POKUTY, SOCIÁLNY ASPEKT

8.1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo za každý deň omeškania.

To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonávaním stavebných prác podľa schváleného vecného a časového harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) a odstraňovaním vád a nedorobkov diela. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) dni, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

8.2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 166 € za každé menej závažné porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa tejto zmluvy a vo výške 1 660 € za každé hrubé porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa tejto zmluvy.

8.3. **Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 660 € za porušenie povinnosti uplatnenia „sociálneho aspektu“ podľa ods. 8.6. tohto článku zmluvy.**

8.4. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany doručenej povinnej zmluvnej strane.

8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná oprávnenou zmluvnou stranou voči povinnej zmluvnej strane v plnej výške.

8.6. **V rámci tejto zákazky sa uplatňuje aspekt sociálneho verejného obstarávania. Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:**

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.
Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie).
Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
Zhotoviteľ na preukázanie splnenia tejto povinnosti je povinný Objednávateľovi predložiť dokumenty preukazujúce jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov podľa osobitného predpisu a pod.).

9. POISTENIE

9.1. **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celého plnenia predmetu zmluvy má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom minimálne do výšky hodnoty zákazky (v Eur s DPH). Poistenie sa týka zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia zhotoviteľa) resp. pri živelných pohromách a to na sumu minimálne do výšky hodnoty zákazky (v Eur s DPH).**

9.2. Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 9.1 tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

9.3. V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti spôsobenej zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 9.1 tohto článku na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou spôsobenou zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 9.1 tohto článku nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí.

9.4. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 9.1 až 9.3 tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

9.5. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) dní od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 9.2 tohto článku.

10. MLČANLIVOSŤ

10.1. Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „**dotknutá zmluvná strana**“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom

obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „**dôverné informácie**“).

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť,

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich,

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu, pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou.

10.3. V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 10.2 tohto článku zmluvnou stranou je dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 300 €, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností.

11. OSOBNÉ ÚDAJE

11.1. Na základe poskytnutých informácií zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, (ďalej len „**dotknutá osoba**“) týmto vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany objednávateľa (ďalej len „**prevádzkovateľ**“) na stanovené účely, vrátane získavania osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, monitorovania pracoviska prevádzkovateľa a tretích strán pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu, získavania osobných údajov aj od inej osoby, spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, sprístupňovania a poskytovania osobných údajov tretím stranám.

11.2. Súhlas podľa odseku 11.1. tohto článku sa vzťahuje

a) na osobné údaje dotknutej osoby, ktorými sú titul, meno, priezvisko (aj rodné a predchádzajúce), dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, miesta, na ktorom sa zdržuje, trvalého pobytu, prechodného pobytu a tolerovaného pobytu, telefónne čísla, číslo bankového účtu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, vzdelanie, odborné kurzy, certifikáty, osvedčenia, podnikateľské oprávnenia a povolenia, ostatné oprávnenia a povolenia, údaje týkajúce sa zamestnania, údaje o plnení záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, údaje potrebné pre správu a vymáhanie záväzkov dotknutej osoby podľa tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, všetky písomnosti, vrátane písomností osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa dotknutej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracúvania,

b) na nasledovné účely, ktorými sú uzatvorenie tejto zmluvy a prípadných ďalších zmlúv súvisiacich s touto zmluvou a ich plnenie a prípadné vymáhanie, vedenie účtovnej evidencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, plnenie povinností na úseku daní, priamy marketing, udržiavanie poštového styku a evidencia osobných údajov, ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a tretích strán, výkon oprávnených činností prevádzkovateľa a tretích strán, kontrola plnenia tejto zmluvy a prípadných ďalších zmlúv súvisiacich s touto zmluvou, dodržiavania právnych predpisov, ostatných predpisov a pokynov na zaistenie BOZP, PO a OH, ako aj plnenia úloh dotknutej osoby, občianske súdne konania, konania o priestupkoch a iné správne konania a plnenie povinností a realizovanie všetkých úloh prevádzkovateľa a tretích strán podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

c) na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, najmenej však na dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d) aj na tretie strany, ktorými sú osoby priamo alebo nepriamo majetkovo a personálne prepojené s prevádzkovateľom, ich zástupcovia, audítori, daňoví a iní poradcovia, osoby, s ktorými je prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu, ako aj osoby, o ktorých to ustanovujú právne predpisy.

11.3. Dotknutá osoba je zároveň oprávnená kedykoľvek uplatniť písomnú námietku proti využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku a proti poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Táto námietka sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov na iné účely.

11.4. Súhlas podľa odseku 11.1. tohto článku môže byť dotknutou osobou odvolaný iba v prípade porušenia povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov uvedených v odseku 11.1. tohto článku. Toto oprávnenie sa neuplatní v prípadoch, ak spracúvanie osobných údajov vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy.

11.5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená s podmienkami spracúvania osobných údajov, so svojimi právami na úseku ochrany osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú správne a úplné. Dotknutá osoba berie na vedomie, že za nepravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá. Zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať prevádzkovateľa o zmenách v osobných údajoch.

12. DORUČOVANIE

12.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „**oznámenia**“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo faxom, e-mailom.

12.2 Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 12.1 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované telefonicky v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu, resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.
Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú adresu:
Obec: Kuzmice
Sídlo: Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
kontaktné osoby:
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Vincej – starosta obce
vo veciach technických: stavebný dozor: Ing. Miroslav Vaško, [redacted]
(verejný obstarávateľ doplní údaj najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy)
tel. [redacted]
e-mail [redacted]
Pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú adresu:
NOVICOM s.r.o.
Slivník 61, 076 12 Slivník
kontaktné osoby:
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Novák
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
vo veciach technických: Ing. Radovan Novák
stavbyvedúci: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail [redacted]
alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

12.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.

13.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, pre prípadné zmeny zmluvy sa riadia ust. § 18 zákona č. 343/2015 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnenia podľa zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom príspevku.

13.4. Objednávateľ má právo odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií od zmluvy v prípade, keď ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

13.5. Túto Zmluvu možno meniť len dohodou Zmluvných strán v písomnej forme ako dodatok v súlade s ust. 18 zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy podľa jej ustanovení alebo podľa zákona.

13.6. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.

13.7. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

13.8. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú Zmluvnú stranu.

13.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že objednávateľ doručí zhotoviteľovi oznámenie o pozitívnom overení správnosti postupu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, ktorého výsledkom je táto Zmluva. Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného oznámenia zhotoviteľovi. Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.

13.10. Táto Zmluva podlieha zverejneniu na webovom sídle objednávateľa podľa osobitného predpisu.

13.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

13.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer vrátane zoznamu použitých ekvivalentných položiek *(ak sa uplatňuje)*

príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram

príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov *(ak sa uplatňuje)*

Za objednávateľa: **Za zhotoviteľa:**

V Kuzmiciach dňa _____ V Slivníku, dňa 26.05.2021

Príloha č. 1 – Rozpočet - ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice**

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.5.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**475 224,96**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**475 224,96**	**95 044,99**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**570 269,95**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice**

Miesto: **Kuzmice**
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**475 224,96**	**570 269,95**
01	**SO 01 - Hlavný objekt - Predškolské zariadenie**	347 683,76	417 220,51
02	**SO 01 - Hlavný objekt - zdravotechnika**	43 982,46	52 778,95
03	**SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie**	26 427,99	31 713,59
04	**SO 01 - Hlavný objekt - elektroinštalácia**	18 129,28	21 755,14
05	**SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia**	12 009,19	14 411,03
06	**SO 02 - Spevnené plochy**	14 318,01	17 181,61
07	**SO 03 - Oplotenie**	5 848,59	7 018,31
08	**SO 04 - Úprava jestvujúcej kanalizácie**	1 009,20	1 211,04
09	**SO 05 - Exteriérové hracie plochy**	5 816,48	6 979,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
01 - SO 01 - Hlavný objekt - Predškolské zariadenie

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **347 683,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	347 683,76	20,00%	69 536,75

Cena s DPH **v** **EUR** **417 220,51**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
01 - SO 01 - Hlavný objekt - Predškolské zariadenie

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**347 683,76**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	138 386,06
1 - ZEMNE PRÁCE	6,62
2 - ZÁKLADY	41,55
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	33 754,46
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	25 471,91
5 - KOMUNIKÁCIE	5 467,27
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	66 871,44
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 772,81
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	209 297,70
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 310,07
713 - Izolácie tepelné	29 575,29
721 - Vnútorná kanalizácia	0,00
731 - Kotolne	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	42 454,75
763 - Konštrukcie - drevostavby	14 497,52
764 - Konštrukcie klampiarske	29 732,46
765 - Krytiny tvrdé	3 188,73
766 - Konštrukcie stolárske	8 678,37
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	32 321,47
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4 175,83
776 - Podlahy povlakové	21 445,59
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	10 990,52
783 - Nátery	5 212,13
784 - Maľby	2 714,97
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
M21 - 155 Elektromontáže	0,00
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
01 - SO 01 - Hlavný objekt - Predškolské zariadenie

Miesto: Kuzmice
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**347 683,76**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				138 386,06
	D	1	ZEMNE PRÁCE				6,62
3	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,608	10,89	6,62
	D	2	ZÁKLADY				41,55
24	K	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	m3	0,486	85,50	41,55
	D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				33 754,46
28	K	31127-2205	Murivo stĺpov nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	0,383	235,00	90,01
29	K	31127-3137	Murivo nosné z presných tvárnic hr.200 mm	m3	0,837	165,00	138,11
31	K	31127-3139	Murivo nosné z presných tvárnic hr.375 mm	m3	15,491	123,65	1 915,46
32	K	31127-3140	Murivo nosné z presných tvárnic hr.450 mm	m3	93,737	122,50	11 482,78
34	K	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	24,000	4,85	116,40
42	*M*	*593219254*	*Preklad nenosný 125 x 25 x 10 cm (NP2)*	*ks*	*3,000*	*21,45*	*64,35*
43	*M*	*593219255*	*Preklad nenosný 125 x 25 x 15 cm (NP1)*	*ks*	*21,000*	*29,24*	*614,04*
45	K	31712-1103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	kus	30,000	9,15	274,50
46	*M*	*593 217520*	*Pórobet. nosný preklad 225X25X15 (KP11,21)*	*kus*	*14,000*	*71,00*	*994,00*
47	*M*	*593 217600*	*Pórobet. nosný preklad 225X25X30 (KP11,21)*	*kus*	*14,000*	*78,55*	*1 099,70*
48	*M*	*593 406570*	*Keramický preklad predpätý 2250x120x65mm (KP1)*	*kus*	*2,000*	*19,99*	*39,98*
49	K	31732-1511	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,970	90,00	357,30
50	K	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	17,400	16,90	294,06
51	K	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	17,400	6,35	110,49
52	K	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	t	0,528	1 325,00	699,60
53	K	34227-2336	Priečky z presných tvárnic hr.100mm	m2	50,763	22,00	1 116,79
54	K	34227-2536	Priečky z presných tvárnic hr.150mm	m2	415,387	24,00	9 969,29
55	K	34892-2310	Plot. múrik z bet.tvaroviek hr. 190 mm výplň bet. tr. C 16/20	m3	36,480	120,00	4 377,60
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				25 471,91
56	K	41113-5004	Montáž strop. panelov z predpätého betónu 5-7 t	kus	28,000	80,00	2 240,00
57	*M*	*593 468090*	*Doska stropná predpätá hr. 250 mm šír. 1200 mm*	*m*	*261,950*	*78,00*	*20 432,10*
58	*M*	*593 468360*	*Doska stropná predpätá hr. 250 mm šír. 900 mm*	*m*	*20,150*	*55,00*	*1 108,25*
65	K	41732-1515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	5,866	90,00	527,94
66	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	29,647	8,35	247,55
67	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	29,647	2,94	87,16
68	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,397	1 325,00	526,03
75	K	43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	19,998	9,40	187,98
76	K	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	7,413	12,50	92,66
77	K	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	7,413	3,00	22,24
	D	5	KOMUNIKÁCIE				5 467,27
78	K	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 8-16 mm hr. 100 mm	m2	5,016	2,80	14,04
79	K	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 8-16 mm hr. 150 mm	m2	175,000	3,80	665,00
80	K	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm hr. 200 mm	m2	180,016	5,00	900,08
81	K	56480-1112	Podklad zo štrkodrte fr. 2-4 mm hr. 40 mm	m2	175,000	1,83	320,25
82	K	28997-0110	Vrstva z geotextílie 200g/m2	m2	175,000	0,95	166,25
83	K	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m2	m2	175,000	10,55	1 846,25
84	*M*	*592 450010*	*Dlažba zámková hr. 60 mm*	*m2*	*176,750*	*8,80*	*1 555,40*
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				66 871,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	61147-3112	Omietka vnút. stropov vápennocementová, ľahčená	m2	347,070	9,00	3 123,63
86	K	61245-6211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou /pod keram. obklad/	m2	429,258	1,45	622,42
87	K	61246-5114	Príprava podkladu pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	1 797,143	0,70	1 258,00
88	K	61246-5135	Vnútorná omietka stien vápennocementová, ľahčená	m2	1 797,143	7,50	13 478,57
88a	K	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	2 615,950	3,00	7 847,85
89	K	62240-5424	Omietka vonk. stien vápennocementová, ľahčená	m2	818,797	10,60	8 679,25
90	K	62246-4232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová škrabaná - fasádna	m2	756,123	10,40	7 863,68
91	K	62246-4311	Omietka vonk. stien mozaiková - soklová	m2	62,674	19,50	1 222,14
92	K	62514-6202	Zateplenie ostenia, nadpražia XPS polystyrén hr. 30 mm	m2	36,435	21,05	766,96
94	K	62525-8112	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS hr. izol. 120 mm	m2	31,000	35,03	1 085,93
95	K	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm /podlahy/	m3	54,938	95,00	5 219,11
97	K	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm /vonk. vstupy, schod./	m3	6,422	91,00	584,40
100	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,120	1 350,00	162,00
101	K	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	0,893	5,80	5,18
102	K	63247-7005	Samonivelačný poter hrúbky 3 mm	m2	185,150	5,80	1 073,87
103	K	63247-7006	Samonivelačný poter hrúbky 5 mm	m2	751,660	7,70	5 787,78
104	K	63292-1411	Dlažba z betónových dlaždíc protišmyk. hr. 4 cm kladených do flex. lepidla /vrátane stupňov a podstupníc/	m2	40,733	30,00	1 221,99
105	K	63711-1112	Odkvapový chodník zo štrkopiesku, podklad fr. 0-32 hr. 150 mm so zhutnením	m2	23,500	5,00	117,50
106	K	63712-1101	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva, riečny štrk hr. 50 mm	m2	23,500	8,50	199,75
107	K	28997-0111	Vrstva z geotextílie 200g/m2 prisypaním	m2	23,500	0,95	22,33
108	K	28997-0310	Zvislá nopova fólia vrátane ukonč.lišty	m2	28,200	3,30	93,06
109	K	63731-1122	Odkvapový chodník, spevn. plochy z betónových parkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	m	116,500	6,50	757,25
110	K	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	38,000	36,50	1 387,00
111	*M*	*553 314170*	*Zárubňa oceľová 60x197cm*	*kus*	*4,000*	*22,79*	*91,16*
112	*M*	*553 314190*	*Zárubňa oceľová 70x197cm*	*kus*	*6,000*	*23,30*	*139,80*
113	*M*	*553 314210*	*Zárubňa oceľová 80x197cm*	*kus*	*12,000*	*23,09*	*277,08*
114	*M*	*553 314230*	*Zárubňa oceľová 90x197cm*	*kus*	*14,000*	*23,85*	*333,90*
115	*M*	*553 319880*	*Zárubňa oceľová 90x250cm*	*kus*	*2,000*	*30,18*	*60,36*
116	K	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	kus	4,000	130,00	520,00
117	*M*	*553 324340*	*Zárubňa oceľová 80x197 cm PO*	*kus*	*4,000*	*40,50*	*162,00*
118	K	64892-1214	Osadenie betón. platní krycích š.260 mm, hr. 40 mm – soklov	m	65,000	2,25	146,25
119	*M*	*592 422640*	*Platna bet krycia soklova rovná 40x26x4cm*	*kus*	*164,125*	*3,30*	*541,61*
120	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	87,810	5,00	439,05
121	*M*	*611 9A0203*	*Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.300 mm*	*m*	*87,810*	*18,00*	*1 580,58*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				6 772,81
123	K	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	575,383	2,20	1 265,84
124	K	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	575,383	1,20	690,46
125	K	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	575,383	1,20	690,46
126	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	550,926	2,30	1 267,13
127	K	94195-5005	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy nad 3,5 m	m2	17,900	3,65	65,34
128	K	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 079,860	1,50	1 619,79
129	K	95690-1111	Osadenie hasiacich prístrojov	kus	7,000	4,00	28,00
130	*M*	*553 041920*	*Hasiaci prístroj práškový prenosný, 6kg*	*kus*	*7,000*	*26,75*	*187,25*
131	K	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	1 597,563	0,60	958,54
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				209 297,70
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 310,07
132	K	71110-6111	Hydroizolačný náter vodorovný /vrátane kútových izol. profilov/	m2	141,350	3,50	494,73
133	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	630,243	3,10	1 953,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP	m2	74,896	4,32	323,55
135	*M*	*628 322810*	*Pás ťažký asfaltový*	*m2*	*802,346*	*1,85*	*1 484,34*
136	K	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,580	15,00	53,70
	D	713	Izolácie tepelné				29 575,29
137	K	71311-2217	Montáž tepelnej izolácie striekaná hr. do 30 cm vodorovne	m2	720,818	3,00	2 162,45
138	*M*	*283 1F0432*	*Polyuretánová penová izolácia hr. 300 mm*	*m2*	*735,234*	*21,00*	*15 439,91*
139	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	936,810	0,70	655,77
140	*M*	*283 1BA413*	*Doska podlahová polystyrénová hr. 40mm*	*m2*	*330,725*	*2,80*	*926,03*
141	*M*	*283 1BA418*	*Doska podlahová polystyrénová hr.100mm*	*m2*	*624,821*	*8,95*	*5 592,15*
142	K	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	170,711	4,00	682,84
143	*M*	*283 1B0306*	*Polystyrén extrudovaný hr.80 mm*	*m2*	*174,622*	*11,52*	*2 011,65*
144	K	71319-1121	Izolácia tepelná stien, nopová fólia zvislá	m2	170,711	2,60	443,85
145	K	71319-1131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	m2	936,810	1,00	936,81
146	K	71319-1410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie	m2	720,818	0,95	684,78
147	K	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,603	15,00	39,05
	D	721	Vnútorná kanalizácia				0,00
148	K	72110-	Zdravotechnika /vid diel ZTI/ - samostatný rozpočet	sub	1,000	0,00	0,00
	D	731	Kotolne				0,00
153	K	73110-	Ústredné vykurovanie /vid diel ÚVK/ - samostatný rozpočet	sub	1,000	0,00	0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				42 454,75
154	K	76233-2100	Montáž väzníkov klincovaných prierez. plocha do 120 cm2	m	2 419,890	3,80	9 195,58
155	K	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	670,200	3,80	2 546,76
156	K	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	1 178,600	4,50	5 303,70
157	K	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	102,000	7,62	777,24
158	*M*	*605 151500*	*Hranené rezivo SM 1*	*m3*	*40,969*	*210,00*	*8 603,49*
159	K	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	875,000	3,20	2 800,00
160	*M*	*605 103440*	*Doska SM 1 hr. 22 mm*	*m3*	*21,175*	*210,00*	*4 446,75*
161	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	40,969	24,00	983,26
162	K	76242-0011	Obloženie previsu strechy z dosiek cementotriesk. skrutk. na zraz hr. dosky 8 mm	m2	174,086	12,00	2 089,03
163	K	76284-1110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	720,818	2,50	1 802,05
164	*M*	*605 103440*	*Doska SM 1 hr. 22 mm*	*m3*	*17,444*	*210,00*	*3 663,24*
165	K	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	48,730	5,00	243,65
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				14 497,52
166	K	76313-3022	Podhľady sadrokartónové protipožiarne, dosky RF hr. 15 mm	m2	546,190	21,50	11 743,09
167	K	76313-3042	Podhľady sadrokartónové protipožiarne impregnované, dosky RFI hr. 15 mm	m2	83,850	24,50	2 054,33
168	K	76316-8729	Sadrokartónové stienky na oc. konštr.	m2	34,418	16,80	578,22
169	K	76316-8749	Sadrokartónový obklad zvislých zvodov	m2	5,490	17,85	98,00
170	K	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,592	15,00	23,88
	D	764	Konštrukcie klampiarske				29 732,46
171	K	76417-1319	Strešná krytina ľahká /falcovaný poplast. plech so stojatou drážkou/ vrátane príslušenstva /snehové zábrany, lávka, odve	m2	875,000	23,00	20 125,00
172	K	76417-1485	Vetracia hlavica DN 110	kus	5,000	18,50	92,50
173	K	76417-2070	Štítové lemovanie rš 247 sklon do 30° (14/K)	m	20,000	4,30	86,00
174	K	76417-2083	Hrebeň z hrebenáčov rovných rš 416 sklon do 30° (13/K)	m	25,000	14,50	362,50
175	K	76417-2105	Odvetranie hrebeňa sklon do 30° (3)	kus	5,000	11,00	55,00
176	K	76417-2106	Vetrací profil pod hrebenáč rš 168 (16/K)	m	65,000	9,10	591,50
177	K	76471-1112	Oplechovanie pri čele strechy rš 160 (17/K)	m	66,000	7,50	495,00
178	K	76471-1114	Oplechovanie parapetov z poplast. pl. rš 250-300	m	87,800	10,70	939,46
179	K	76472-1114	Oplechovanie okapu z poplast. pl. rš 247 (15/K)	m	162,000	10,00	1 620,00
180	K	76473-1113	Oplechovanie múrov z poplast. pl. rš 300 mm (18/K)	m	8,000	12,90	103,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	76475-1111	Rúry odkvapové z poplast. pl. d 90 mm (4/K)	m	10,000	20,50	205,00
182	K	76475-1112	Rúry odkvapové z poplast. pl. d 100 mm (2/K)	m	55,000	22,20	1 221,00
183	K	76475-1113	Rúry odkvapové z poplast. pl. d 125 mm (3/K)	m	12,000	29,60	355,20
184	K	76475-1131	Horné koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d 90 mm (10/K)	kus	2,000	9,50	19,00
185	K	76475-1132	Horné koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d 100 mm (9/K)	kus	13,000	11,50	149,50
186	K	76475-1142	Výtokové koleno odkvapové z poplast. pl. d 100 mm (12/K)	kus	2,000	12,00	24,00
187	K	76476-1132	Žľab pododkvapný z poplast. pl. 150 mm (1/K)	m	150,000	20,00	3 000,00
188	K	76476-1171	Čelo žľabu z poplast. pl. 125 mm (11/K)	kus	4,000	2,70	10,80
189	K	76476-1172	Čelo žľabu z poplast. pl. 150 mm (19/K)	kus	8,000	2,85	22,80
190	K	76476-1231	Kotlík z poplast. pl. 125x90 pre kruh žľab (6/K)	kus	2,000	12,45	24,90
191	K	76476-1232	Kotlík z poplast. pl. 150x100 pre kruh žľab (5/K)	kus	13,000	14,00	182,00
192	K	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	9,619	5,00	48,10
	D	765	Krytiny tvrdé				3 188,73
193	K	76590-1144	Zakr šikm striech podstrešná hydroizol. fólia	m2	875,000	3,64	3 185,00
194	K	99876-5101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	0,149	25,00	3,73
	D	766	Konštrukcie stolárske				8 678,37
195	K	76611-9111	Montáž sanitárnych stien	m2	5,040	8,36	42,13
196	*M*	*607 2B0108*	*Sanitárna deliaca priečka z laminovanej dosky DTD 28 mm na oc. nožkách, 700x1200 mm (S7*	*kus*	*16,000*	*95,50*	*1 528,00*
197	K	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	22,000	14,90	327,80
198	*M*	*611 617130*	*Dvere vnútorné plné 600x1970 mm hladké, so zámkom a kovaním (S1)*	*kus*	*4,000*	*59,50*	*238,00*
199	*M*	*611 617170*	*Dvere vnútorné plné 700x1970 mm hladké, so zámkom a kovaním (S2)*	*kus*	*6,000*	*63,50*	*381,00*
200	*M*	*611 617210*	*Dvere vnútorné plné 800x1970 mm hladké, so zámkom a kovaním (S3)*	*kus*	*12,000*	*67,50*	*810,00*
201	K	76662-1262	Montáž nadsvetlíka do 0,81m2	kus	2,000	12,00	24,00
202	K	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad	kus	15,000	14,90	223,50
203	*M*	*611 617250*	*Dvere vnútorné plné 900x1970 mm hladké, so zámkom a kovaním (S4)*	*kus*	*14,000*	*70,00*	*980,00*
204	*M*	*611 617410*	*Dvere vnútorné plné 900x1970 mm hladké, so zámkom a kovaním, s nadsvetlíkom 900x500 mm (S4*)*	*kus*	*2,000*	*147,60*	*295,20*
205	K	76666-1412	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	4,000	22,00	88,00
206	*M*	*611 653110*	*Dvere vnútorné plné 800x1970 mm hladké, so zámkom a kovaním, požiarno-odolné EW30/D3-C (S3*)*	*kus*	*4,000*	*170,00*	*680,00*
207	K	76666-4141	Montáž dvier kompl. posuvných 2-kríd. nad 1,45m	kus	4,000	36,20	144,80
208	*M*	*611 617400*	*Dvere vnútorné plné posuvné 2-kr. 2000x2020 mm hladké, so zámkom a kovaním (S5)*	*kus*	*4,000*	*199,20*	*796,80*
209	K	76667-2161	Podkrovné schody 700x1300 mm v.3100 protipožiarne PO 45 min	kus	4,000	200,00	800,00
210	K	76668-2121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 170 mm	kus	6,000	54,70	328,20
211	*M*	*611 8A0040*	*Zárubne obložkové 1200x2000 mm (S6)*	*kus*	*2,000*	*80,00*	*160,00*
212	*M*	*611 8A0140*	*Zárubne obložkové 2000x2020 mm (S5)*	*kus*	*4,000*	*105,00*	*420,00*
213	K	76669-5211	Montáž prechodových líšt vnút. dvier	m	44,200	3,30	145,86
214	*M*	*611 873920*	*Prechodová lišta podlahová (S1-S4)*	*m*	*44,200*	*5,50*	*243,10*
215	K	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,465	15,00	21,98
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				32 321,47
216	K	76711-3130	Montáž stien a priečok pre zaskl. z AL profilov do 12	m2	33,773	8,33	281,33
217	*M*	*553 4C2001*	*Hliníková zasklenná stena 5000x2850 mm s 2-kr. dverami a nadsvetlíkom (ZS1)*	*kus*	*1,000*	*2 600,00*	*2 600,00*
218	*M*	*553 4C2002*	*Hliníková zasklenná stena 4950x2850 mm s 1-kr. dverami a nadsvetlíkom (ZS2)*	*kus*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*
219	*M*	*553 4C2003*	*Hliníková zasklenná stena 1900x2850 mm s 2-kr. dverami a nadsvetlíkom (ZS3)*	*kus*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*
220	K	76716-5110	Montáž zábradlia rovného madiel z rúrok skrutkovaním	m	16,000	2,68	42,88
221	*M*	*553 3B00Z1*	*Schodiskové madlo oceľové d 50 mm dĺ. 11 m (Z1)*	*kus*	*1,000*	*297,00*	*297,00*
222	*M*	*553 3B00Z7*	*Schodiskové madlo oceľové d 50 mm dĺ. 2,5 m (Z7)*	*kus*	*2,000*	*67,50*	*135,00*
223	K	76722-1110	Montáž zábradlia z rúrok	m	40,500	3,33	134,87
224	*M*	*553 3B00Z2*	*Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, dĺ. 10 m (Z2)*	*kus*	*1,000*	*297,68*	*297,68*
225	*M*	*553 3B00Z3*	*Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, pre imobilných dĺ. 5,7 m (Z3)*	*kus*	*2,000*	*170,10*	*340,20*
226	*M*	*553 3B00Z4*	*Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, dĺ. 1,0 m (Z4)*	*kus*	*2,000*	*29,77*	*59,54*
227	*M*	*553 3B00Z5*	*Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, dĺ. 5,3 m (Z5)*	*kus*	*1,000*	*157,82*	*157,82*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
228	*M*	*553 3B00Z6*	*Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, dĺ. 2,9 m (Z6)*	*kus*	*2,000*	*86,47*	*172,94*
229	*M*	*553 3B00Z8*	*Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, dĺ. 6,0 m (Z8)*	*kus*	*1,000*	*178,61*	*178,61*
230	K	76751-0111	Montáž poklopov ľahkých, osadenie	kus	1,000	14,85	14,85
231	*M*	*553 402750*	*Poklop oceľový ľahký so zámkom 60x60cm*	*kus*	*1,000*	*47,66*	*47,66*
232	K	76763-1510	Montáž okien a zaskl. stien plastových	m	296,040	7,59	2 246,94
233	*M*	*611 4B1631*	*Okno plast.1-krídlové OS - 600x750 mm (a)*	*kus*	*1,000*	*98,00*	*98,00*
234	*M*	*611 4B1634*	*Okno plast.1-krídlové OS - 600x1000 mm (h)*	*kus*	*2,000*	*110,00*	*220,00*
235	*M*	*611 4B1690*	*Okno plast.1-krídlové OS - 810x1000 mm (i)*	*kus*	*1,000*	*125,00*	*125,00*
236	*M*	*611 4B2292*	*Okno plast.2-krídlové O+OS - 1600x1250 mm (g)*	*kus*	*1,000*	*260,00*	*260,00*
237	*M*	*611 4B2323*	*Okno plast.2-krídlové posuvné - 1800x1500 mm (o)*	*kus*	*2,000*	*800,00*	*1 600,00*
238	*M*	*611 4B2343*	*Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x750 mm (l)*	*kus*	*2,000*	*230,00*	*460,00*
239	*M*	*611 4B2346*	*Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x1000 mm (b)*	*kus*	*11,000*	*250,00*	*2 750,00*
240	*M*	*611 4B2348*	*Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x1250 mm (d)*	*kus*	*2,000*	*300,00*	*600,00*
241	*M*	*611 4B2353*	*Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x1740 mm (n)*	*kus*	*4,000*	*380,00*	*1 520,00*
242	*M*	*611 4B2355*	*Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x1850 mm (e)*	*kus*	*2,000*	*390,00*	*780,00*
243	*M*	*611 4B2357*	*Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x1950 mm (k)*	*kus*	*4,000*	*400,00*	*1 600,00*
244	*M*	*611 4B2358*	*Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x2000 mm (c)*	*kus*	*4,000*	*450,00*	*1 800,00*
245	*M*	*611 4B4707*	*Okno plast.4-krídlové O+3xP - 2000x3370 mm (f)*	*kus*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*
246	*M*	*611 4B4711*	*Okno plast.5-krídlové 3xOS+2xO - 5000x1740 mm (m)*	*kus*	*2,000*	*1 150,00*	*2 300,00*
247	*M*	*611 4B4712*	*Okno plast.5-krídlové 3xOS+2xO - 5000x1950 mm (j)*	*kus*	*2,000*	*1 200,00*	*2 400,00*
248	K	76764-1510	Montáž dverí plastových a zaskl. stien	m	23,380	7,45	174,18
249	*M*	*611 3A0891*	*Dvere vstupné plastové 2-krídlové s nadsvetlíkom 1890x2850 mm (2)*	*kus*	*1,000*	*1 300,00*	*1 300,00*
250	*M*	*611 3A0942*	*Dvere vstupné plastové 1-krídlové s nadsvetlíkom 1000x2350 mm (1)*	*kus*	*1,000*	*750,00*	*750,00*
251	*M*	*611 3A0954*	*Dvere vstupné plastové 1-krídlové s nadsvetlíkom 1000x2600 mm (3)*	*kus*	*1,000*	*800,00*	*800,00*
252	K	76783-2100	Montáž rebríkov do muriva	m	3,600	10,87	39,13
253	*M*	*553 042411*	*Oceľ. rebrík dĺ. 3,6 m s ochr. nátermi*	*kus*	*1,000*	*71,55*	*71,55*
254	*M*	*553 042430*	*Oceľ. schodisko 10x188/279 mm s jednostr. zábradlím, š. 1,2m dĺ. 2,68+1,5 m*	*kus*	*1,000*	*864,00*	*864,00*
255	K	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	42,33	2,29
	D	771	Podlahy z dlaždíc keramických				4 175,83
256	K	77147-3113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	m	68,200	5,30	361,46
257	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	189,650	11,00	2 086,15
258	*M*	*597 3A0191*	*Keramická dlažba protišmyková*	*m2*	*200,945*	*8,00*	*1 607,56*
259	K	77158-9795	Prípl. za škárovanie škár. hmotou pri mont. podláh keram.	m2	189,650	0,55	104,31
260	K	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	1,090	15,00	16,35
	D	776	Podlahy povlakové				21 445,59
261	K	77629-0020	Montáž kovovej hrany na schodišťových stupňoch	m	30,800	2,00	61,60
262	*M*	*194 238200*	*Schodisková ochranná Al hrana*	*m*	*31,416*	*2,19*	*68,80*
263	K	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	m	452,110	1,40	632,95
264	*M*	*284 1A9004*	*Profil podlahový PVC sokel*	*m*	*465,673*	*0,55*	*256,12*
265	K	77651-1810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	5,900	2,32	13,69
266	K	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	453,320	12,50	5 666,50
267	*M*	*284 1A1001*	*Krytina podlahová PVC, hr.2,5 mm*	*m2*	*462,386*	*13,50*	*6 242,21*
268	K	77657-2110	Voľné položenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	334,140	4,50	1 503,63
269	*M*	*697 410000*	*Koberec záťažový hr. 5 mm*	*m2*	*340,823*	*20,50*	*6 986,87*
270	K	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,769	17,19	13,22
	D	781	Obklady z obkladačiek a dosiek				10 990,52
271	K	78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 300x200 do malty	m2	429,258	17,00	7 297,39
272	*M*	*597 4A2036*	*Keramický obklad*	*m2*	*437,843*	*7,80*	*3 415,18*
273	K	78148-9704	Prípl. za škárovanie škár. hmotou pri mont. obkl. keram.	m2	429,258	0,30	128,78
274	K	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	29,833	5,00	149,17
	D	783	Nátery				5 212,13
275	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe	m2	1 820,056	2,00	3 640,11
276	K	78382-4120	Nátery betónových podláh dvojnásobné	m2	7,150	8,38	59,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
277	K	78389-4612	Náter podhľadov stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 2x	m2	630,040	2,40	1 512,10
	D	784	Maľby				2 714,97
278	K	78445-3101	Maľby vnút. stropov dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach v. do 3.8	m2	347,070	1,35	468,54
279	K	78445-3111	Maľby vnút. stien dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach v. do 3.8	m2	1 797,143	1,25	2 246,43
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	M21	155 Elektromontáže				0,00
280	K	21001-	Elektroinštalácie /vid diel ELI/ - samostatný rozpočet	sub	1,000	0,00	0,00
	D	M24	158 Montáž VZT zariadení a sušiarní				0,00
281	K	24000-	Vzduchotechnika /vid diel VZT/ - samostatný rozpočet	sub	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
02 - SO 01 - Hlavný objekt - zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**43 982,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	43 982,46	20,00%	8 796,49

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**52 778,95**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
02 - SO 01 - Hlavný objekt - zdravotechnika

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**43 982,46**
HSV - HSV	10 207,73
1 - Zemné práce	4 644,32
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 256,00
99 - Presun hmôt HSV	307,41
PSV - Práce a dodávky PSV	33 774,73
713 - Izolácie tepelné	2 107,77
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	5 134,65
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	15 167,34
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	11 364,97

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
02 - SO 01 - Hlavný objekt - zdravotechnika

Miesto: Kuzmice
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 982,46**
	D	HSV	HSV				10 207,73
	D	1	Zemné práce				4 644,32
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	54,000	8,55	461,70
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	54,000	0,50	27,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	106,620	21,00	2 239,02
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	106,620	1,80	191,92
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	55,476	1,20	66,57
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	118,044	9,55	1 127,32
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,360	12,20	297,19
8	*M*	*5833743700*	*Štrkopiesok preddrvený 0-16 N*	*m3*	*23,360*	*10,00*	*233,60*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 256,00
9	*M*	*2869200331*	*Vsakovacia jama d2000,hl.3000,hr.steny150mm*	*sub*	*2,000*	*2 628,00*	*5 256,00*
	D	99	Presun hmôt HSV				307,41
10	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	35,954	8,55	307,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 774,73
	D	713	Izolácie tepelné				2 107,77
11	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	533,000	2,10	1 119,30
12	*M*	*2837741534*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 18/ 9-DG (190)*	*m*	*180,000*	*0,20*	*36,00*
13	*M*	*2837741547*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 22/ 9-DG (162)*	*m*	*210,000*	*0,25*	*52,50*
14	*M*	*2837741560*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 28/ 9-DG (126)*	*m*	*70,000*	*0,30*	*21,00*
15	*M*	*2837741573*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 35/ 9-DG (92)*	*m*	*73,000*	*0,35*	*25,55*
16	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	151,000	2,92	440,92
17	*M*	*2837741583*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 42/30-DG (24)*	*m*	*86,000*	*2,50*	*215,00*
18	*M*	*2837741599*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 54/30-DG (22)*	*m*	*45,000*	*3,10*	*139,50*
19	*M*	*2837741610*	*Izolácia z penového polyethylénu- trubica 64/13-DG (32)*	*m*	*20,000*	*2,90*	*58,00*
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				5 134,65
20	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	40,000	12,00	480,00
21	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,	m	45,000	13,50	607,50
22	K	721172111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 125x2, 8	m	120,000	10,00	1 200,00
23	K	721172112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 160x3, 9	m	25,000	15,25	381,25
24	K	721173203	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	15,000	5,05	75,75
25	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	20,000	5,25	105,00
26	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	6,10	91,50
27	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	28,000	2,63	73,64
28	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	19,000	2,91	55,29
29	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	21,000	4,30	90,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	721212305	Podlahový vpust s lievikom	ks	4,000	24,88	99,52
31	K	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	27,000	10,26	277,02
32	K	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	6,000	12,00	72,00
33	K	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0	ks	6,000	16,00	96,00
34	K	721221128	Zápachová uzávierka pre kond.kotol	ks	1,000	12,50	12,50
35	K	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	12,000	73,20	878,40
36	K	7212731451	Privzdušňovacia hlavica novodurová 110	ks	4,000	26,50	106,00
37	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	385,000	0,81	311,85
38	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	25,000	1,03	25,75
39	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,711	1,10	95,38
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				15 167,34
40	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	15,000	12,55	188,25
41	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	40,000	14,50	580,00
42	K	722190222	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb	2,000	79,63	159,26
43	K	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb	1,000	102,89	102,89
44	K	722190224	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	súb	1,000	123,65	123,65
45	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	103,000	6,00	618,00
46	*M*	*2864810100*	*Nástenka 20x1/2*	*ks*	*103,000*	*3,76*	*387,28*
47	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	95,000	5,80	551,00
48	*M*	*4225701600*	*Guľový ventil MF,PN 25 1/2",s páčkou*	*ks*	*93,000*	*3,55*	*330,15*
49	*M*	*4223050300*	*Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm*	*ks*	*2,000*	*3,80*	*7,60*
50	*M*	*42230503001*	*Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm*	*ks*	*93,000*	*4,20*	*390,60*
51	K	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	5,000	4,35	21,75
52	*M*	*55174005601*	*Guľový kohút 2" voda*	*ks*	*2,000*	*27,30*	*54,60*
53	*M*	*55174011301*	*Spätná klapka zvislá 2"*	*ks*	*1,000*	*15,17*	*15,17*
54	*M*	*55174011302*	*Filter s red.vent.tlaku DN50*	*ks*	*1,000*	*125,00*	*125,00*
55	*M*	*55105001*	*Bezpeč.armatura BA 295 DN50*	*ks*	*1,000*	*640,00*	*640,00*
56	K	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	súb.	2,000	210,00	420,00
57	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	684,000	0,35	239,40
58	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	684,000	0,45	307,80
59	K	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	180,000	10,40	1 872,00
60	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	210,000	11,90	2 499,00
61	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	70,000	14,50	1 015,00
62	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	58,000	15,20	881,60
63	K	722172631	Potrubie DN 40,0x5,5 v tyčiach	m	46,000	23,80	1 094,80
64	K	722172632	Potrubie DN 50,0x6,9 v tyčiach	m	45,000	32,84	1 477,80
65	K	722172633	Potrubie DN 63,0x8,6 v tyčiach	m	20,000	48,55	971,00
66	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	187,478	0,50	93,74
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				11 364,97
67	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	21,000	14,00	294,00
68	*M*	*6420139570*	*Sanitárna keramika detské WC + sedátko*	*ks*	*21,000*	*79,00*	*1 659,00*
69	K	725119711	Montáž záchodov	súb	21,000	38,00	798,00
70	*M*	*5516423005458*	*WC nádržka*	*ks*	*21,000*	*58,00*	*1 218,00*
71	*M*	*5516423005472*	*WC tlacidlo*	*ks*	*21,000*	*54,80*	*1 150,80*
72	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	27,000	28,00	756,00
73	*M*	*6420139090*	*Sanitárna keramika umývadlo detské*	*ks*	*16,000*	*35,50*	*568,00*
74	*M*	*6420139130*	*Umývadlo*	*ks*	*9,000*	*33,50*	*301,50*
75	*M*	*64201390901*	*Sanitárna keramika umývadlo invalidne*	*ks*	*2,000*	*95,00*	*190,00*
76	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	6,000	38,00	228,00
77	*M*	*5542303200*	*Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela*	*ks*	*6,000*	*76,70*	*460,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	6,000	35,00	210,00
79	*M*	*5548443200*	*Kút sprchový napr.CLASSIC - CD0 2/900rozmer 880-940cm*	*ks*	*6,000*	*165,00*	*990,00*
80	K	725319102	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu s použitím silikónového tmelu	súb	6,000	11,00	66,00
81	*M*	*5523134500*	*Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA*	*ks*	*6,000*	*50,00*	*300,00*
82	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	20,00	60,00
83	*M*	*6420137930*	*výlevka*	*ks*	*3,000*	*148,00*	*444,00*
84	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	36,000	9,50	342,00
85	*M*	*55146520001*	*Stojanková umývadlová batéria pre inv.*	*ks*	*2,000*	*22,20*	*44,40*
86	*M*	*5514652000*	*Stojanková umývadlová batéria*	*ks*	*25,000*	*20,00*	*500,00*
87	*M*	*5514662240*	*Stojanková drezová batéria napr. RAF TAMIGI TM05*	*ks*	*9,000*	*29,90*	*269,10*
88	*M*	*5510001*	*Montážny rám napr. Sanitarblock, pre sklopné sedatko do sprchy imobilní*	*ks*	*1,000*	*123,20*	*123,20*
89	*M*	*5510002*	*Sklopné sedatko do sprchy imobilní*	*ks*	*1,000*	*87,50*	*87,50*
90	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	3,00	18,00
91	*M*	*5514360700*	*Sprchová batéria so sprch.súpravou napr.KLUDI-MIX*	*ks*	*6,000*	*43,80*	*262,80*
92	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	163,114	0,15	24,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
03 - SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**26 427,99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	26 427,99	20,00%	5 285,60

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**31 713,59**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
03 - SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**26 427,99**
PSV - Práce a dodávky PSV	26 427,99
713 - Izolácie tepelné	5 366,90
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	2 825,06
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	4 914,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 671,58
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	7 648,41
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	2 002,04

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
03 - SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie

Miesto: Kuzmice
Dátum: 26.05.2021
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 427,99**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 427,99
	D	713	Izolácie tepelné				5 366,90
1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	1 232,000	2,60	3 203,20
2	*M*	*2837741544*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 22/30-DG (46)*	*m*	*12,000*	*1,70*	*20,40*
3	*M*	*2837741531*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 18/30-DG (46)*	*m*	*1 150,000*	*1,50*	*1 725,00*
4	*M*	*2837741558*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 28/30-DG (32)*	*m*	*25,000*	*1,90*	*47,50*
5	*M*	*2837741571*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 35/30-DG (28)*	*m*	*45,000*	*2,00*	*90,00*
6	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	52,000	2,90	150,80
7	*M*	*2837741583*	*Izolácia z penového polyethylénu - trubica 42/30-DG (24)*	*m*	*52,000*	*2,50*	*130,00*
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				2 825,06
8	K	731241083	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	súb.	1,000	440,00	440,00
9	K	73124108201	Uvedenie do prevádzky	súb	1,000	80,00	80,00
10	*M*	*010002*	*Kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 356/5-5*	*ks*	*1,000*	*1 550,00*	*1 550,00*
11	*M*	*010003*	*Regulácia 470f*	*ks*	*1,000*	*240,00*	*240,00*
12	*M*	*0100021*	*VR40*	*sub*	*1,000*	*54,17*	*54,17*
13	*M*	*0100022*	*VR61*	*sub*	*1,000*	*125,00*	*125,00*
14	*M*	*01000221*	*VR10*	*sub*	*2,000*	*17,50*	*35,00*
15	K	73124108202	Montáž odvodu spalín	súb	1,000	25,00	25,00
16	*M*	*01006511*	*Komin FK DN100/60/250*	*ks*	*2,000*	*21,39*	*42,78*
17	*M*	*01006512*	*Komin FK DN100/60/500*	*ks*	*3,000*	*30,03*	*90,09*
18	*M*	*01006513*	*Komin T-kus priamy K DN100/60*	*ks*	*1,000*	*60,28*	*60,28*
19	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	25,074	3,30	82,74
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				4 914,00
20	K	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	1 150,000	1,60	1 840,00
21	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	12,000	12,50	150,00
22	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	25,000	15,50	387,50
23	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	45,000	13,90	625,50
24	K	7331615051	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	52,000	23,50	1 222,00
25	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 232,000	0,40	492,80
26	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	52,000	0,50	26,00
27	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	170,197	1,00	170,20
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 671,58
28	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	1,00	8,00
29	*M*	*48442284617101*	*Vypúšťací ventil DN 1/2" s hadicovou prípojkou*	*ks*	*4,000*	*2,49*	*9,96*
30	*M*	*48442284617102*	*AO ventil DN 1/2"*	*ks*	*4,000*	*4,93*	*19,72*
31	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	246,000	1,00	246,00
32	*M*	*4848901570*	*Vykurovanie - príslušenstvo adapter pre rúrky z plastu, chróm, 18x16x2*	*ks*	*164,000*	*5,10*	*836,40*
33	*M*	*48489015701*	*Vykurovanie - príslušenstvo redukcia 3/4"-1/2"*	*ks*	*82,000*	*1,41*	*115,62*
34	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	54,000	3,30	178,20
35	*M*	*48489030302*	*Vykurovanie - armatúra radiatorova na VK 3/4"-18*	*ks*	*41,000*	*8,76*	*359,16*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	*M*	*4844228461444*	*Herz ventil regulačný 3/4", šikmý*	*ks*	*8,000*	*30,46*	*243,68*
37	*M*	*4848906430*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 3/4"*	*ks*	*2,000*	*6,00*	*12,00*
38	*M*	*551740113011*	*Spätná klapka zvislá 3/4"*	*ks*	*1,000*	*6,41*	*6,41*
39	*M*	*551740113021*	*Filter DN20*	*ks*	*1,000*	*10,39*	*10,39*
40	*M*	*551740113022*	*Poistný ventil DN20/10bar*	*ks*	*1,000*	*22,27*	*22,27*
41	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000	3,90	62,40
42	*M*	*4844228461445*	*Herz ventil regulačný 1", šikmý*	*ks*	*2,000*	*38,04*	*76,08*
43	*M*	*4848906440*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1"*	*ks*	*2,000*	*8,26*	*16,52*
44	*M*	*48489064401*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1" so šrub.*	*ks*	*10,000*	*11,35*	*113,50*
45	*M*	*484890643078*	*Bezpečnostna armatúra k expanzomatu Reflex DN25*	*ks*	*2,000*	*50,00*	*100,00*
46	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	12,000	4,66	55,92
47	*M*	*55174005601*	*Guľový kohút 5/4" voda*	*ks*	*8,000*	*10,20*	*81,60*
48	*M*	*55174011301*	*Spätná klapka zvislá 5/4"*	*ks*	*2,000*	*11,20*	*22,40*
49	*M*	*55174011302*	*Filter DN32*	*ks*	*1,000*	*9,89*	*9,89*
50	*M*	*551740113028*	*Flamcovent clear smart DN32*	*ks*	*1,000*	*210,10*	*210,10*
51	K	734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	1,000	5,93	5,93
52	*M*	*484890643079*	*3-cestný ventil esbe DN32*	*ks*	*1,000*	*109,00*	*109,00*
53	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	41,000	1,58	64,78
54	*M*	*0100081*	*Termostatická hlavica*	*ks*	*41,000*	*10,00*	*410,00*
55	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	5,000	18,67	93,35
56	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	4,000	41,20	164,80
57	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	29,990	0,25	7,50
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				7 648,41
58	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	14,000	10,50	147,00
59	*M*	*4845395100*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0400 úzke*	*ks*	*1,000*	*78,85*	*78,85*
60	*M*	*4845395150*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0500*	*ks*	*1,000*	*80,55*	*80,55*
61	*M*	*4845395250*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600*	*ks*	*2,000*	*87,68*	*175,36*
62	*M*	*4845395450*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800*	*ks*	*1,000*	*102,55*	*102,55*
63	*M*	*4845400250*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0400*	*ks*	*1,000*	*82,93*	*82,93*
64	*M*	*4845400350*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600*	*ks*	*1,000*	*95,55*	*95,55*
65	*M*	*4845400450*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0800 AAA*	*ks*	*2,000*	*111,93*	*223,86*
66	*M*	*4845400550*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA*	*ks*	*3,000*	*122,70*	*368,10*
67	*M*	*4845400650*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 22K 600x1200 AAA*	*ks*	*2,000*	*138,35*	*276,70*
68	*M*	*484540025001*	*Konzola napr.korad*	*ks*	*41,000*	*1,80*	*73,80*
69	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	27,000	12,00	324,00
70	*M*	*4845396050*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400*	*ks*	*8,000*	*135,50*	*1 084,00*
71	*M*	*4845398700*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 400x1400*	*ks*	*4,000*	*133,30*	*533,20*
72	*M*	*4845400750*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1400 AAA*	*ks*	*6,000*	*154,00*	*924,00*
73	*M*	*4845400850*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 22K 600x1600*	*ks*	*8,000*	*145,00*	*1 160,00*
74	*M*	*4845400950*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové napr.KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1800*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*
75	K	735311670	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine	ks	5,000	12,50	62,50
76	*M*	*0400012215*	*Rozdeľovač R553D 1"-18/6*	*ks*	*1,000*	*174,31*	*174,31*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	*M*	*0400012216*	*Rozdeľovač R553D 1"-18/7*	*ks*	*2,000*	*200,36*	*400,72*
78	*M*	*0400012217*	*Rozdeľovač R553D 1"-18/9*	*ks*	*1,000*	*253,45*	*253,45*
79	*M*	*0400012218*	*Rozdeľovač R553D 1"-18/12*	*ks*	*1,000*	*335,59*	*335,59*
80	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	5,000	11,86	59,30
81	*M*	*4848903630*	*Skrinka rozdelovača do steny, 400x450x110 mm*	*ks*	*1,000*	*41,95*	*41,95*
82	*M*	*48489036301*	*Skrinka rozdelovača do steny, 500x450x110 mm*	*ks*	*2,000*	*75,08*	*150,16*
83	*M*	*4848903640*	*Skrinka rozdelovača do steny, 600x450x110 mm*	*ks*	*1,000*	*45,39*	*45,39*
84	*M*	*48489036401*	*Skrinka rozdelovača do steny, 700x450x110 mm*	*ks*	*1,000*	*89,69*	*89,69*
85	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	74,940	1,60	119,90
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				2 002,04
86	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb.	1,000	99,43	99,43
87	*M*	*0100023*	*Ohrievač vody napr.Vaillant VIH R 300*	*ks*	*1,000*	*955,00*	*955,00*
88	*M*	*01000231*	*HST32Z*	*ks*	*1,000*	*363,33*	*363,33*
89	K	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb.	1,000	77,33	77,33
90	K	732331543	Expanzomat s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 18 l	súb.	1,000	71,55	71,55
91	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	2,000	12,62	25,24
92	*M*	*4268150024*	*čerpadlo napr. ALPHA+ 32-60 180 1x230V 50Hz*	*ks*	*1,000*	*221,24*	*221,24*
93	*M*	*4268152259*	*čerpadlo napr. UP 15-14 BUT 80 1x230V 50Hz*	*ks*	*1,000*	*188,92*	*188,92*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
04 - SO 01 - Hlavný objekt - elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **18 129,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	18 129,28	20,00%	3 625,86

Cena s DPH **v** **EUR** **21 755,14**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
04 - SO 01 - Hlavný objekt - elektroinštalácia

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**18 129,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 509,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 509,02
M - Práce a dodávky M	15 153,26
21-M - Elektromontáže	14 779,26
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	374,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	467,00

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
04 - SO 01 - Hlavný objekt - elektroinštalácia

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 129,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 509,02
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 509,02
1	K	953941711	Osadenie objímky alebo držiaka v murive tehlovom	ks	60,000	4,15	249,00
2	*M*	*M6*	*Upevňovací držiak na káble OBO-Grip 2031 M30*	*ks*	*60,000*	*0,95*	*57,00*
3	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	42,000	2,33	97,86
4	K	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm-otvor pre rozvádzač	ks	3,000	9,64	28,92
5	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	102,000	1,12	114,24
6	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	900,000	2,18	1 962,00
	D	M	Práce a dodávky M				15 153,26
	D	21-M	Elektromontáže				14 779,26
7	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	30,000	1,29	38,70
8	*M*	*3450710300*	*Rúrka FXP 25m (zvody uzemnenia)*	*ks*	*30,000*	*2,33*	*69,90*
9	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	99,000	1,14	112,86
10	*M*	*3450915000*	*Krabica univerzálna napr. typ: KU 68 LA/1*	*ks*	*99,000*	*0,74*	*73,26*
11	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	51,000	1,14	58,14
12	*M*	*3410300448*	*Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA*	*ks*	*51,000*	*1,58*	*80,58*
13	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	8,000	3,62	28,96
14	*M*	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*8,000*	*1,39*	*11,12*
15	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	200,000	0,85	170,00
16	*M*	*2830402500*	*Hmoždinka na uchytenie káblov 8 mm typ: KRT8*	*ks*	*200,000*	*0,06*	*12,00*
17	*M*	*2830037600*	*Sťahovacia páska prírodná 140 x 3,6 mm typ: 150*	*ks*	*200,000*	*0,03*	*6,00*
18	K	210021521	Tesnenie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky	ks	45,000	22,68	1 020,60
19	*M*	*2459261010*	*Náterová hmota protipožiarna napr.PYROSTOP CP-protipožiarny tmel na požiarne upchávky káblových prestupov*	*kg*	*10,000*	*10,05*	*100,50*
20	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	69,000	0,97	66,93
21	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,45	21,75
22	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,89	18,90
23	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	44,000	2,12	93,28
24	*M*	*3450201360*	*Spínač 1 lesklý biely*	*ks*	*44,000*	*5,20*	*228,80*
25	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	3,000	2,77	8,31
26	*M*	*3450230200*	*Spínač 5 lesklý biely*	*ks*	*3,000*	*6,50*	*19,50*
27	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,42	4,84
28	*M*	*3450230800*	*Spínač č. 6*	*ks*	*2,000*	*10,30*	*20,60*
29	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	2,72	5,44
30	*M*	*3450231600*	*Spínač č. 7 lesklý biely*	*ks*	*2,000*	*10,27*	*20,54*
31	K	210110095	Spínače VCON6 pre rekuperačnú jednotku-montáž	ks	10,000	6,38	63,80
32	K	210110501	Vypínač 40A na DIN lištu-doplnenie RM2	ks	1,000	6,39	6,39
33	*M*	*3580260000*	*vypínač na DIN lištu 40A*	*ks*	*1,000*	*13,30*	*13,30*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	39,000	4,69	182,91
35	*M*	*3450318300*	*Zásuvka zapustená dvojitá*	*ks*	*39,000*	*2,81*	*109,59*
36	K	210111114	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	6,48	6,48
37	*M*	*3450339000*	*Zásuvka nástenná 3253*	*ks*	*1,000*	*6,02*	*6,02*
38	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A-dozbrojenie HR	ks	3,000	5,33	15,99
39	*M*	*3580760181*	*Istič LPN-32B-3*	*ks*	*1,000*	*19,36*	*19,36*
40	K	210201220	Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovatelné so žiarovkou-typ LV	ks	1,000	5,33	5,33
41	*M*	*3580760182*	*Istič LPN-40B-3*	*ks*	*2,000*	*26,34*	*52,68*
42	K	210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie-doplnenie HR	ks	1,000	19,33	19,33
43	*M*	*3890114300*	*MG-Elektrom.dig. 3P 63A 17075*	*ks*	*1,000*	*153,33*	*153,33*
44	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	13,24	39,72
45	*M*	*M1*	*Elektrorozvádzač RK*	*ks*	*1,000*	*615,00*	*615,00*
46	*M*	*M2*	*Elektrorozvádzač RP1*	*ks*	*1,000*	*416,00*	*416,00*
47	*M*	*M3*	*Elektrorozvádzač RP2*	*ks*	*1,000*	*306,00*	*306,00*
48	K	210201001	Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, nástenného interierového so žiarovkou-typ F	ks	4,000	5,02	20,08
49	*M*	*3486301210*	*Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40,*	*ks*	*4,000*	*29,59*	*118,36*
50	*M*	*M10*	*LED žiarovka E27/16W-1440 lm klasik teplá*	*ks*	*4,000*	*4,20*	*16,80*
51	K	210201002	Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného interierového so žiarovkou-typ E	ks	35,000	5,10	178,50
52	*M*	*3486301280*	*Interiérové svietidlo žiarivkové 1x75 W, IP20,*	*ks*	*35,000*	*20,00*	*700,00*
53	*M*	*M10*	*LED žiarovka E27/16W-1440 lm klasik teplá*	*ks*	*35,000*	*4,20*	*147,00*
54	K	210201005	Zapojenie svietidlá IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou s pohyb.senzorom-typ I	ks	12,000	5,17	62,04
55	*M*	*3483301000*	*Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 1x18W,IP 20 s pohyb.senzorom*	*ks*	*12,000*	*44,70*	*536,40*
56	*M*	*M10*	*LED žiarovka E27/16W-1440 lm klasik teplá*	*ks*	*12,000*	*4,20*	*50,40*
57	K	210201015	Zapojenie svietidlá IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou-typ G	ks	6,000	5,78	34,68
58	*M*	*3483101000*	*Žiarovkové priemyselné svietidlo 1x60W, IP54, D=220mm*	*ks*	*6,000*	*16,57*	*99,42*
59	*M*	*M10*	*LED žiarovka E27/16W-1440 lm klasik teplá*	*ks*	*6,000*	*4,20*	*25,20*
60	K	210201041	Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=36W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou-typ B	ks	75,000	5,10	382,50
61	*M*	*3486301630*	*Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP20, EVG*	*ks*	*75,000*	*21,09*	*1 581,75*
62	*M*	*M11*	*LED trubica T8 120cm 18W teplá biela*	*ks*	*150,000*	*18,50*	*2 775,00*
63	K	210201220	Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovatelné so žiarovkou-typ LV	ks	1,000	5,33	5,33
64	*M*	*3486301920*	*Žiarivkové zabudovateľné svietidlo 1x13W,bodové*	*ks*	*1,000*	*22,07*	*22,07*
65	K	210201520	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim-typ D	ks	5,000	4,56	22,80
66	*M*	*3486801160*	*Podhľadové núdzové svietidlo LED 1x3W, IP22, 1 hodina, D=80mm núdzový režim*	*ks*	*5,000*	*37,57*	*187,85*
67	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	2,000	14,76	29,52
68	*M*	*3410300252*	*Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA*	*ks*	*2,000*	*2,13*	*4,26*
69	*M*	*3410301600*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3*	*ks*	*2,000*	*15,79*	*31,58*
70	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	2,79	22,32
71	*M*	*3544247920*	*Štítok orientačný 0, bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*8,000*	*0,50*	*4,00*
72	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	2,54	20,32
73	*M*	*3544220000*	*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	*ks*	*8,000*	*1,31*	*10,48*
74	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	2,54	40,64
75	*M*	*3544221300*	*Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A*	*ks*	*16,000*	*0,91*	*14,56*
76	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	190,000	1,90	361,00
77	*M*	*3544245350*	*Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8*	*kg*	*25,650*	*6,06*	*155,44*
78	K	210220811	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	98,000	1,41	138,18
79	*M*	*3544241400*	*Podpera vedenia na vrchol krovu zliatina AlMgSi označenie PV 15 A*	*ks*	*98,000*	*2,33*	*228,34*
80	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	6,36	6,36
81	*M*	*3544240250*	*Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al*	*ks*	*1,000*	*11,54*	*11,54*
82	K	210220840	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	ks	1,000	6,76	6,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	*M*	*3544240450*	*Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva zliatina AlMgSi označenie DJ 2*	*ks*	*1,000*	*5,06*	*5,06*
84	K	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	1,000	0,76	0,76
85	*M*	*3544216300*	*Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04*	*ks*	*1,000*	*1,92*	*1,92*
86	*M*	*3544240850*	*Ochranná strieška horná zliatina AlMgSi označenie OS 02*	*ks*	*1,000*	*1,15*	*1,15*
87	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	48,000	1,78	85,44
88	*M*	*3544243100*	*Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr Al*	*ks*	*48,000*	*1,31*	*62,88*
89	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	8,000	2,54	20,32
90	*M*	*3544243550*	*Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al*	*ks*	*8,000*	*3,21*	*25,68*
91	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	20,000	0,38	7,60
92	*M*	*3410350186*	*CYY 6 žz Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*20,000*	*0,66*	*13,20*
93	K	210800072	Vodič medený uložený pod omietkou 450/750 V 3x1,5mm2	m	729,000	0,76	554,04
94	*M*	*3410350369*	*CYKY-j 3x1,5*	*m*	*729,000*	*0,52*	*379,08*
95	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	78,000	0,96	74,88
96	*M*	*3410350101*	*CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*78,000*	*5,16*	*402,48*
97	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	230,000	0,82	188,60
98	*M*	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*230,000*	*0,86*	*197,80*
99	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	10,000	0,95	9,50
100	*M*	*3410350098*	*CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*10,000*	*1,42*	*14,20*
101	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	16,000	1,14	18,24
102	*M*	*3410350099*	*CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*16,000*	*2,23*	*35,68*
103	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	34,000	1,45	49,30
104	*M*	*3410350100*	*CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*34,000*	*3,24*	*110,16*
105	K	210881270	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	61,000	0,65	39,65
106	*M*	*3410350978*	*NHXH 3x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE*	*m*	*61,000*	*1,42*	*86,62*
107	*M*	*5850001000*	*Sádra stavebná*	*kg*	*80,000*	*0,26*	*20,80*
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				374,00
108	K	220300921	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 1 pólová	ks	200,000	1,68	336,00
109	*M*	*3450644900*	*Svorka WAGO 273-253*	*ks*	*200,000*	*0,19*	*38,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				467,00
110	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-úprava rozv.RM2	hod	20,000	11,45	229,00
111	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	17,00	238,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
05 - SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**12 009,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 009,19	20,00%	2 401,84

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**14 411,03**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
05 - SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 009,19**
D1 - Zariadenie č.1 – Odvetranie hygienických zariadení	1 713,35
D2 - Zariadenie č.2 – Odvetranie zázemia kuchyne	764,24
D3 - Zariadenie č.3 – Rekuperačné vetranie miestností	9 531,60

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
05 - SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia

Miesto: Kuzmice
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 009,19**
	D	D1	Zariadenie č.1 – Odvetranie hygienických zariadení				1 713,35
0	K	Pol3	Stropný resp. stenový radiálny ventilátor napr.MICRO 100 T	ks	6,000	80,50	483,00
0	K	Pol4	Stropný resp. stenový napr. MEDIO T	ks	2,000	116,60	233,20
0	K	Pol5	Stropný resp. stenový napr.SUPER T	ks	1,000	152,30	152,30
0	K	Pol6	Kruhová strieška KS 125 - 2	ks	1,000	11,50	11,50
0	K	Pol7	Kruhová strieška KS 100 - 2	ks	2,000	10,30	20,60
0	K	Pol8	Dverová mriežka obojstranná napr.NOVA-D-1-525x125-UR1	ks	1,000	24,97	24,97
0	K	Pol9	Dverová mriežka obojstranná napr.NOVA-D-1-325x125-UR1	ks	8,000	18,86	150,88
0	K	Pol10	Vonkajšia krycia mriežka C-UM-Z-S-166x166	ks	1,000	2,50	2,50
0	K	Pol11	Ohybná hadica napr.ALUVAC, 102	bm	15,000	1,20	18,00
0	K	Pol12	Kruhové potrubie napr.SPIRO do priemeru Ø 125 mm	bm	30,000	4,20	126,00
0	K	Pol13	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	7,000	5,20	36,40
0	K	Pol14	tvarovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	10,000	5,90	59,00
0	K	Pol15	Samolepiaca kaučuková izolácia napr.Armaflex s hliníkovou povrchovou úpravou hr. 13mm (izolovať rozvody vedené v krove)	m2	8,000	9,50	76,00
0	K	Pol16	Montážny, tesniaci a spájací materiál	kpl	1,000	75,00	75,00
0	K	Pol17	MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním 30% z ceny dodávky	kpl	1,000	244,00	244,00
	D	D2	Zariadenie č.2 – Odvetranie zázemia kuchyne				764,24
0	K	Pol18	Potrubný radiálny ventilátor CK 200B	ks	1,000	111,80	111,80
0	K	Pol19	Regulátor otáčok R10	ks	1,000	29,80	29,80
0	K	Pol20	Spojovacia manžeta MK 200	ks	2,000	4,30	8,60
0	K	Pol21	Samočinná žalúzia WSK 20	ks	1,000	28,60	28,60
0	K	Pol22	Kruhový tlmič hluku rúrový SPT-GLX 200/1000	ks	1,000	65,10	65,10
0	K	Pol8	Dverová mriežka obojstranná napr.NOVA-D-1-525x125-UR1	ks	2,000	24,97	49,94
0	K	Pol23	Kovový odvodný tanierový ventil DVS 160	ks	2,000	7,30	14,60
0	K	Pol24	Kovový odvodný tanierový ventil DVS 125	ks	3,000	4,80	14,40
0	K	Pol25	Kovový odvodný tanierový ventil DVS 100	ks	1,000	4,20	4,20
0	K	Pol11	Ohybná hadica napr.ALUVAC, 102	bm	3,000	1,20	3,60
0	K	Pol26	Ohybná hadica napr.ALUVAC, 127	bm	3,000	1,50	4,50
0	K	Pol27	Kruhové potrubie napr.SPIRO Ø 200 mm	bm	5,000	7,10	35,50
0	K	Pol28	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	2,000	6,80	13,60
0	K	Pol29	tvarovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	2,000	9,10	18,20
0	K	Pol30	Kruhové potrubie napr.SPIRO Ø 160 mm	bm	9,000	5,40	48,60
0	K	Pol31	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	4,000	3,80	15,20
0	K	Pol32	tvarovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	5,000	7,60	38,00
0	K	Pol33	Montážny, tesniaci a spájací materiál	kpl	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol34	MONTÁŽ zariadenia č.2 - porovnaním 25% z ceny dodávky	kpl	1,000	210,00	210,00
	D	D3	Zariadenie č.3 – Rekuperačné vetranie miestností				9 531,60
0	K	Pol35	Stenová rekuperačná jednotka so spätným získavaním tepla HR 300	ks	14,000	454,00	6 356,00
0	K	Pol36	Predlžovací nástavec EXT 300	ks	14,000	76,50	1 071,00
0	K	Pol37	Nástenný ovládač VCON6	ks	14,000	90,60	1 268,40
0	K	Pol38	Prepojovací kábel medzi jednotkou a ovládačom	bm	120,000	1,20	144,00
0	K	Pol39	MONTÁŽ zariadenia č.3 - porovnaním 20% z ceny dodávky	kpl	1,000	240,00	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	*M*	*Pol40*	*Doprava*	*3,00%*	*1,400*	*323,00*	*452,20*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
06 - SO 02 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**14 318,01**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	14 318,01	20,00%	2 863,60

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**17 181,61**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
06 - SO 02 - Spevnené plochy

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**14 318,01**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	14 318,01
1 - ZEMNE PRÁCE	2 031,20
2 - ZÁKLADY	118,25
5 - KOMUNIKÁCIE	10 280,15
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 888,41

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
06 - SO 02 - Spevnené plochy

Miesto: Kuzmice
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 318,01**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				14 318,01
	D	1	ZEMNE PRÁCE				2 031,20
1	K	12110-1104	Odstránenie ornice s premiestnením do 500 m	m3	65,000	1,80	117,00
2	K	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	93,900	5,10	478,89
3	K	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	28,170	0,50	14,09
4	K	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	93,900	1,30	122,07
5	K	18040-2111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m2	1 150,000	0,60	690,00
6	*M*	*005 724200*	*Zmes trávna parková*	*kg*	*3,485*	*6,50*	*22,65*
7	K	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	1 150,000	0,18	207,00
8	K	18130-1111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	m2	1 150,000	0,25	287,50
9	K	18340-3151	Obrobenie pôdy spúšťaním v rovine	m2	1 150,000	0,03	34,50
10	K	18340-3152	Obrobenie pôdy vláčením v rovine	m2	1 150,000	0,03	34,50
11	K	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	1 150,000	0,02	23,00
	D	2	ZÁKLADY				118,25
12	K	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m2	110,000	0,50	55,00
13	*M*	*693 D00107*	*Geotextília - 200 g/m2*	*m2*	*126,500*	*0,50*	*63,25*
	D	5	KOMUNIKÁCIE				10 280,15
14	K	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy zhutn. na 45 MPa	m2	110,000	1,00	110,00
15	K	56420-1101	Riečny štrk fr. 4-8 mm hr. 40 mm	m2	110,000	18,00	1 980,00
16	K	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 16-32 mm hr. 150 mm	m2	220,000	3,60	792,00
17	K	56427-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm hr. 250 mm vibr.	m2	215,000	5,25	1 128,75
18	K	56486-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	m2	215,000	4,95	1 064,25
19	K	56514-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom OK1, š. do 3 m hr. 60 mm	m2	215,000	12,60	2 709,00
20	K	57714-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	215,000	11,61	2 496,15
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 888,41
21	K	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	125,000	4,50	562,50
22	*M*	*592 174910*	*Obrubník cestný 100x15x26 cm*	*kus*	*126,250*	*5,00*	*631,25*
23	K	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	44,000	4,50	198,00
24	*M*	*592 172040*	*Obrubník záhradný 50x5x15 cm*	*kus*	*88,880*	*1,55*	*137,76*
25	K	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	358,895	1,00	358,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
07 - SO 03 - Oplotenie

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 848,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 848,59	20,00%	1 169,72

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 018,31**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
07 - SO 03 - Oplotenie

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 848,59**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 513,51
1 - ZEMNE PRÁCE	94,35
2 - ZÁKLADY	397,89
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 924,56
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	96,71
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	3 335,08
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 335,08

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
07 - SO 03 - Oplotenie

Miesto: Kuzmice
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 848,59**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 513,51
	D	1	ZEMNE PRÁCE				94,35
1	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,421	8,50	37,58
2	K	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	1,326	0,80	1,06
3	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,421	6,00	26,53
4	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,421	0,60	2,65
5	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	4,421	6,00	26,53
	D	2	ZÁKLADY				397,89
6	K	27531-3612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	4,421	90,00	397,89
	D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				1 924,56
7	K	33817-1121	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC	kus	44,000	6,00	264,00
8	*M*	*313 2A0909*	*Stĺpik poplastovaný oceľový dĺž.2,40 m*	*kus*	*44,000*	*13,00*	*572,00*
9	*M*	*313 2A0934*	*Čapica pre stĺpik*	*kus*	*44,000*	*1,50*	*66,00*
10	K	34812-1121	Osadenie plotových panelov 250/35/2350 mm	kus	44,000	7,18	315,92
11	*M*	*313 2A1122*	*Panel betónový, dĺž./výš/hr.- 2350 / 250 / 35 mm*	*kus*	*44,000*	*16,06*	*706,64*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				96,71
12	K	99815-1111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	t	13,816	7,00	96,71
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				3 335,08
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				3 335,08
13	K	76791-4130	Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m	m	110,000	6,50	715,00
14	*M*	*313 2A0838*	*Panel výš.1,60 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž.2,48 m*	*kus*	*46,000*	*52,00*	*2 392,00*
15	K	76792-0210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	kus	1,000	13,00	13,00
16	*M*	*313 2A2013*	*Bránka oceľová s výplňou z jaklových profilov, profil brány F60 1-kridl., šír.1 m, výš.1,5 m*	*kus*	*1,000*	*200,00*	*200,00*
17	K	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,754	20,00	15,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
08 - SO 04 - Úprava jestvujúcej kanalizácie

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 009,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 009,20	20,00%	201,84

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 211,04**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
08 - SO 04 - Úprava jestvujúcej kanalizácie

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 009,20**
HSV - HSV	809,20
8 - Rúrové vedenie	809,20
PSV - Práce a dodávky PSV	200,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	200,00

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
08 - SO 04 - Úprava jestvujúcej kanalizácie

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 009,20**
	D	HSV	HSV				809,20
	D	8	Rúrové vedenie				809,20
1	*M*	*5922465003*	*Kónus - AK 100/60/62,5/12*	*ks*	*2,000*	*230,00*	*460,00*
2	K	899311111	Osadenie oceľ.alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	14,60	29,20
3	*M*	*5524333000*	*Poklop kruhový 600*	*ks*	*2,000*	*160,00*	*320,00*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				200,00
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				200,00
4	K	721172112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 160x3, 9	m	5,000	40,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
09 - SO 05 - Exteriérové hracie plochy

JKSO:
Miesto: Kuzmice

KS:
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 816,48**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 816,48	20,00%	1 163,30

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**6 979,78**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
09 - SO 05 - Exteriérové hracie plochy

Miesto:	Kuzmice	Dátum:	26.05.2021
Objednávateľ:	Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 816,48**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 816,48
1 - ZEMNE PRÁCE	71,31
2 - ZÁKLADY	223,76
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 396,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	124,82

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
09 - SO 05 - Exteriérové hracie plochy

Miesto: Kuzmice
Dátum: 26.05.2021

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 816,48**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				5 816,48
	D	1	ZEMNE PRÁCE				71,31
1	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,600	10,89	28,31
2	K	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	0,780	0,86	0,67
3	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2,600	6,13	15,94
4	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	2,600	0,72	1,87
5	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	2,600	9,43	24,52
	D	2	ZÁKLADY				223,76
6	K	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	m3	2,600	86,06	223,76
	D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				5 396,59
7	K	34912-1001	Montáž zariadení drobnej architektúry do 1,5 t	kus	7,000	43,90	307,30
8	*M*	*593 11pc01*	*Playsystem 1m*	*kus*	*1,000*	*1 881,60*	*1 881,60*
9	*M*	*593 11pc02*	*Kombinovaná dvojhojdačka*	*kus*	*1,000*	*903,17*	*903,17*
10	*M*	*593 11pc03*	*Nerezová lavička s operadlom*	*kus*	*2,000*	*555,52*	*1 111,04*
11	*M*	*593 11pc04*	*Pružinová hojdačka ryby*	*kus*	*2,000*	*462,34*	*924,68*
12	*M*	*593 11pc05*	*Kovová informačná tabuľa*	*kus*	*1,000*	*268,80*	*268,80*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				124,82
13	K	99815-1111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	t	6,535	19,10	124,82


Príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12, IČO: 36 591 891, IČ DPH: SK2022001465
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16420/V


Harmonogram stavby "Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice"

	Mesiac				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
	Týždeň				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Popis	MJ	Celk. cena [EUR]	Množstvo																																															
20210511	Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice		475 224,96	0,000																																														
01	SO 01 - Hlavný objekt - Predškolské zariadenie		347 683,76	0,000																																													
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV		138 386,06	0,000																																													
1	ZEMNE PRÁCE		6,62	0,000																																													
13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,62	0,608																																													
2	ZÁKLADY		41,55	0,000																																													
27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	m3	41,55	0,486																																												
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		33 754,46	0,000																																												
31127-2205	Murivo stĺpov nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	90,01	0,383																																												
31127-3137	Murivo nosné z presných tvárnic hr.200 mm	m3	138,11	0,837																																												
31127-3139	Murivo nosné z presných tvárnic hr.375 mm	m3	1 915,46	15,491																																												
31127-3140	Murivo nosné z presných tvárnic hr.450 mm	m3	11 482,78	93,737																																												
31712-1101	Montáž prefabrik. preklad pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	794,79	24,000																																												
31712-1103	Montáž prefabrik. preklad pre svetlosť otvoru do 375 cm	kus	2 408,18	30,000																																												
31732-1511	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	m3	357,30	3,970																																												
31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	294,06	17,400																																												
31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	110,49	17,400																																												
31736-1821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	t	699,60	0,528																																												
34227-2336	Priečky z presných tvárnic hr.100mm	m2	1 116,79	50,763																																												
34227-2536	Priečky z presných tvárnic hr.150mm	m2	9 969,29	415,387																																												
34892-2310	Plot. múrik z bet.tvaroviek hr. 190 mm výplň bet. tr. C 16/20	m3	4 377,60	36,480																																												
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		25 471,91	0,000																																												
41113-5004	Montáž strop. panelov z predpätého betónu 5-7 t	kus	23 780,35	28,000																																												
41732-1515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	527,94	5,866																																												
41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	247,55	29,647																																												
41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	87,16	29,647																																												
41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	526,03	0,397																																												
43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	187,98	19,998																																												
43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	92,66	7,413																																												
43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	22,24	7,413																																												
5	KOMUNIKÁCIE		5 467,27	0,000																																												
56423-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 8-16 mm hr. 100 mm	m2	14,04	5,016																																												
56425-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 8-16 mm hr. 150 mm	m2	665,00	175,000																																												
56426-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm hr. 200 mm	m2	900,08	180,016																																												
56480-1112	Podklad zo štrkodrte fr. 2-4 mm hr. 40 mm	m2	320,25	175,000																																												
28997-0110	Vrstva z geotextílie 200g/m2	m2	166,25	175,000																																												
59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m2	m2	3 401,65	175,000																																												
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		66 871,44	0,000																																												
61147-3112	Omietka vnút. stropov vápennocementová, ťahčená	m2	3 123,63	347,070																																												
61245-6211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou /pod keram. obklad/	m2	622,42	429,258																																												
61246-5114	Príprava podkladu pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	1 258,00	1 797,143																																												
61246-5135	Vnútorná omietka stien vápennocementová, ťahčená	m2	13 478,57	1 797,143																																												
61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	7 847,85	2 615,950																																												
62240-5424	Omietka vonk. stien vápennocementová, ťahčená	m2	8 679,25	818,797																																												
62246-4232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová škrabaná - fasádna	m2	7 863,68	756,123																																												
62246-4311	Omietka vonk. stien mozaiková - soklová	m2	1 222,14	62,674																																												
62514-8202	Zateplenie ostenia, nadpražia XPS polystyrén hr. 30 mm	m2	766,96	36,435																																												
62525-8112	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS hr. izol. 120 mm	m2	1 085,93	31,000																																												
63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm /podlahy/	m3	5 219,11	54,938																																												
63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm /vonk. vstupy, schod./	m3	584,40	6,422																																												
63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	162,00	0,120																																												
63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	5,18	0,893																																												
63247-7005	Samonivelačný poter hrúbky 3 mm	m2	1 073,87	185,150																																												
63247-7006	Samonivelačný poter hrúbky 5 mm	m2	5 787,78	751,660																																												
63292-1411	Dlažba z betónových dlaždíc protišmyk. hr. 4 cm kladených do flex. lepidla /vrátane stupňov a podstupníc/	m2	1 221,99	40,733																																												
63711-1112	Odkvapový chodník zo štrkopiesku, podklad fr. 0-32 hr. 150 mm so zhutnením	m2	117,50	23,500																																												
63712-1101	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva, riečny štrk hr. 50 mm	m2	199,75	23,500																																												
28997-0111	Vrstva z geotextílie 200g/m2 prisypaním	m2	22,33	23,500																																												
28997-0310	Zvislá nopova fólia vrátane ukonč.lišty	m2	93,06	28,200																																												
63731-1122	Odkvapový chodník, spevn. plochy z betónových parkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	m	757,25	116,500																																												
64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	2 289,30	38,000																																												
64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kríd. do 2,5 m2	kus	682,00	4,000																																												
64892-1214	Osadenie betón. platní krycích š.260 mm, hr. 40 mm – soklov	m	687,86	65,000																																												
64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	2 019,63	87,810																																												
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		6 772,81	0,000																																												
94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1 265,84	575,383																																												
94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	690,46	575,383																																												
94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	690,46	575,383																																												
94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	1 267,13	550,926																																												
94195-5005	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy nad 3,5 m	m2	65,34	17,900																																												
95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 619,79	1 079,860																																												
95690-1111	Osadenie hasiacich prístrojov	kus	215,25	7,000																																												


99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	958,54	1 597,563
D2	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**		**209 297,70**	**0,000**
711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**		**4 310,07**	**0,000**
71110-6111	Hydroizolačný náter vodorovný /vrátane kútových izol. profilov/	m2	494,73	141,350
71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	1 953,75	630,243
71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	1 807,89	74,896
99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	53,70	3,580
713	**Izolácie tepelné**		**29 575,29**	**0,000**
71311-2217	Montáž tepelnej izolácie striekaná hr. do 30 cm vodorovne	m2	17 602,36	720,818
71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	7 173,95	936,810
71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	2 694,49	170,711
71319-1121	Izolácia tepelná stien, nopová fólia zvislá	m2	443,85	170,711
71319-1131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	m2	936,81	936,810
71319-1410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie	m2	684,78	720,818
99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	39,05	2,603
721	**Vnútorná kanalizácia**		**0,00**	**0,000**
72110-	Zdravotechnika /vid diel ZTI/ - samostatný rozpočet	sub	0,00	1,000
731	**Kotolne**		**0,00**	**0,000**
73110-	Ústredné vykurovanie /vid diel ÚVK/ - samostatný rozpočet	sub	0,00	1,000
762	**Konštrukcie tesárske**		**42 454,75**	**0,000**
76233-2100	Montáž väzníkov klincovaných prierez. plocha do 120 cm2	m	9 195,58	2 419,890
76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	2 546,76	670,200
76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	5 303,70	1 178,600
76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	9 380,73	102,000
76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	7 246,75	875,000
76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	983,26	40,969
76242-0011	Obloženie previsu strechy z dosiek cementotriesk. skrutk. na zraz hr. dosky 8 mm	m2	2 089,03	174,086
76284-1110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	5 465,29	720,818
99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	243,65	48,730
763	**Konštrukcie - drevostavby**		**14 497,52**	**0,000**
76313-3022	Podhľady sadrokartónové protipožiarne, dosky RF hr. 15 mm	m2	11 743,09	546,190
76313-3042	Podhľady sadrokartónové protipožiarne impregnované, dosky RFI hr. 15 mm	m2	2 054,33	83,850
76316-8729	Sadrokartónové stienky na oc. konštr.	m2	578,22	34,418
76316-8749	Sadrokartónový obklad zvislých zvodov	m2	98,00	5,490
99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	23,88	1,592
764	**Konštrukcie klampiarske**		**29 732,46**	**0,000**
76417-1319	Strešná krytina ťahká /falcovaný poplast. plech so stojatou drážkou/ vrátane príslušenstva /snehové zábrany, lávka, odve	m2	20 125,00	875,000
76417-1485	Vetracia hlavica DN 110	kus	92,50	5,000
76417-2070	Štítové lemovanie rš 247 sklon do 30° (14/K)	m	86,00	20,000
76417-2083	Hrebeň z hrebeňáčov rovných rš 416 sklon do 30° (13/K)	m	362,50	25,000
76417-2105	Odvetranie hrebeňa sklon do 30° (3)	kus	55,00	5,000
76417-2106	Vetrací profil pod hrebeňáč rš 168 (16/K)	m	591,50	65,000
76471-1112	Oplechovanie pri čele strechy rš 160 (17/K)	m	495,00	66,000
76471-1114	Oplechovanie parapetov z poplast. pl. rš 250-300	m	939,46	87,800
76472-1114	Oplechovanie okapu z poplast. pl. rš 247 (15/K)	m	1 620,00	162,000
76473-1113	Oplechovanie múrov z poplast. pl. rš 300 mm (18/K)	m	103,20	8,000
76475-1111	Rúry odkvapové z poplast. pl. d 90 mm (4/K)	m	205,00	10,000
76475-1112	Rúry odkvapové z poplast. pl. d 100 mm (2/K)	m	1 221,00	55,000
76475-1113	Rúry odkvapové z poplast. pl. d 125 mm (3/K)	m	355,20	12,000
76475-1131	Horné koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d 90 mm (10/K)	kus	19,00	2,000
76475-1132	Horné koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d 100 mm (9/K)	kus	149,50	13,000
76475-1142	Výtokové koleno odkvapové z poplast. pl. d 100 mm (12/K)	kus	24,00	2,000
76476-1132	Žľab pododkvapný z poplast. pl. 150 mm (1/K)	m	3 000,00	150,000
76476-1171	Čelo žľabu z poplast. pl. 125 mm (11/K)	kus	10,80	4,000
76476-1172	Čelo žľabu z poplast. pl. 150 mm (19/K)	kus	22,80	8,000
76476-1231	Kotlík z poplast. pl. 125x90 pre kruh žľab (6/K)	kus	24,90	2,000
76476-1232	Kotlík z poplast. pl. 150x100 pre kruh žľab (5/K)	kus	182,00	13,000
99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	48,10	9,619
765	**Krytiny tvrdé**		**3 188,73**	**0,000**
76590-1144	Zákr šikm striech podstrešná hydroizol. fólia	m2	3 185,00	875,000
99876-5101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	3,73	0,149
766	**Konštrukcie stolárske**		**8 678,37**	**0,000**
76611-9111	Montáž sanitárnych stien	m2	1 570,13	5,040
76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	1 756,80	22,000
76662-1262	Montáž nadsvetlíka do 0,81m2	kus	24,00	2,000
76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	kus	1 498,70	15,000
76666-1412	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	768,00	4,000
76666-4141	Montáž dvier kompl. posuvných 2-kríd. nad 1,45m	kus	941,60	4,000
76667-2161	Podkrovné schody 700x1300 mm v.3100 protipožiarne PO 45 min	kus	800,00	4,000
76668-2121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 170 mm	kus	908,20	6,000
76669-5211	Montáž prechodových líšt vnút. dvier	m	388,96	44,200
99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	21,98	1,465
767	**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**		**32 321,47**	**0,000**
76711-3130	Montáž stien a priečok pre zaskl. z AL profilov do 12 m2	m2	6 681,33	33,773
76716-5110	Montáž zábradlia rovného madiel z rúrok skrutkovaním	m	474,88	16,000
76722-1110	Montáž zábradlia z rúrok	m	1 341,66	40,500
76751-0111	Montáž poklopov ťahkých, osadenie	kus	62,51	1,000
76763-1510	Montáž okien a zaskl. stien plastových	m	19 759,94	296,040
76764-1510	Montáž dverí plastových a zaskl. stien	m	3 024,18	23,380
76783-2100	Montáž rebríkov do muriva	m	974,68	3,600
99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	2,29	0,054
771	**Podlahy z dlaždíc keramických**		**4 175,83**	**0,000**
77147-3113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	m	361,46	68,200
77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	3 693,71	189,650
77158-9795	Prípl. za škárovanie škár. hmotou pri mont. podláh keram.	m2	104,31	189,650
99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	16,35	1,090

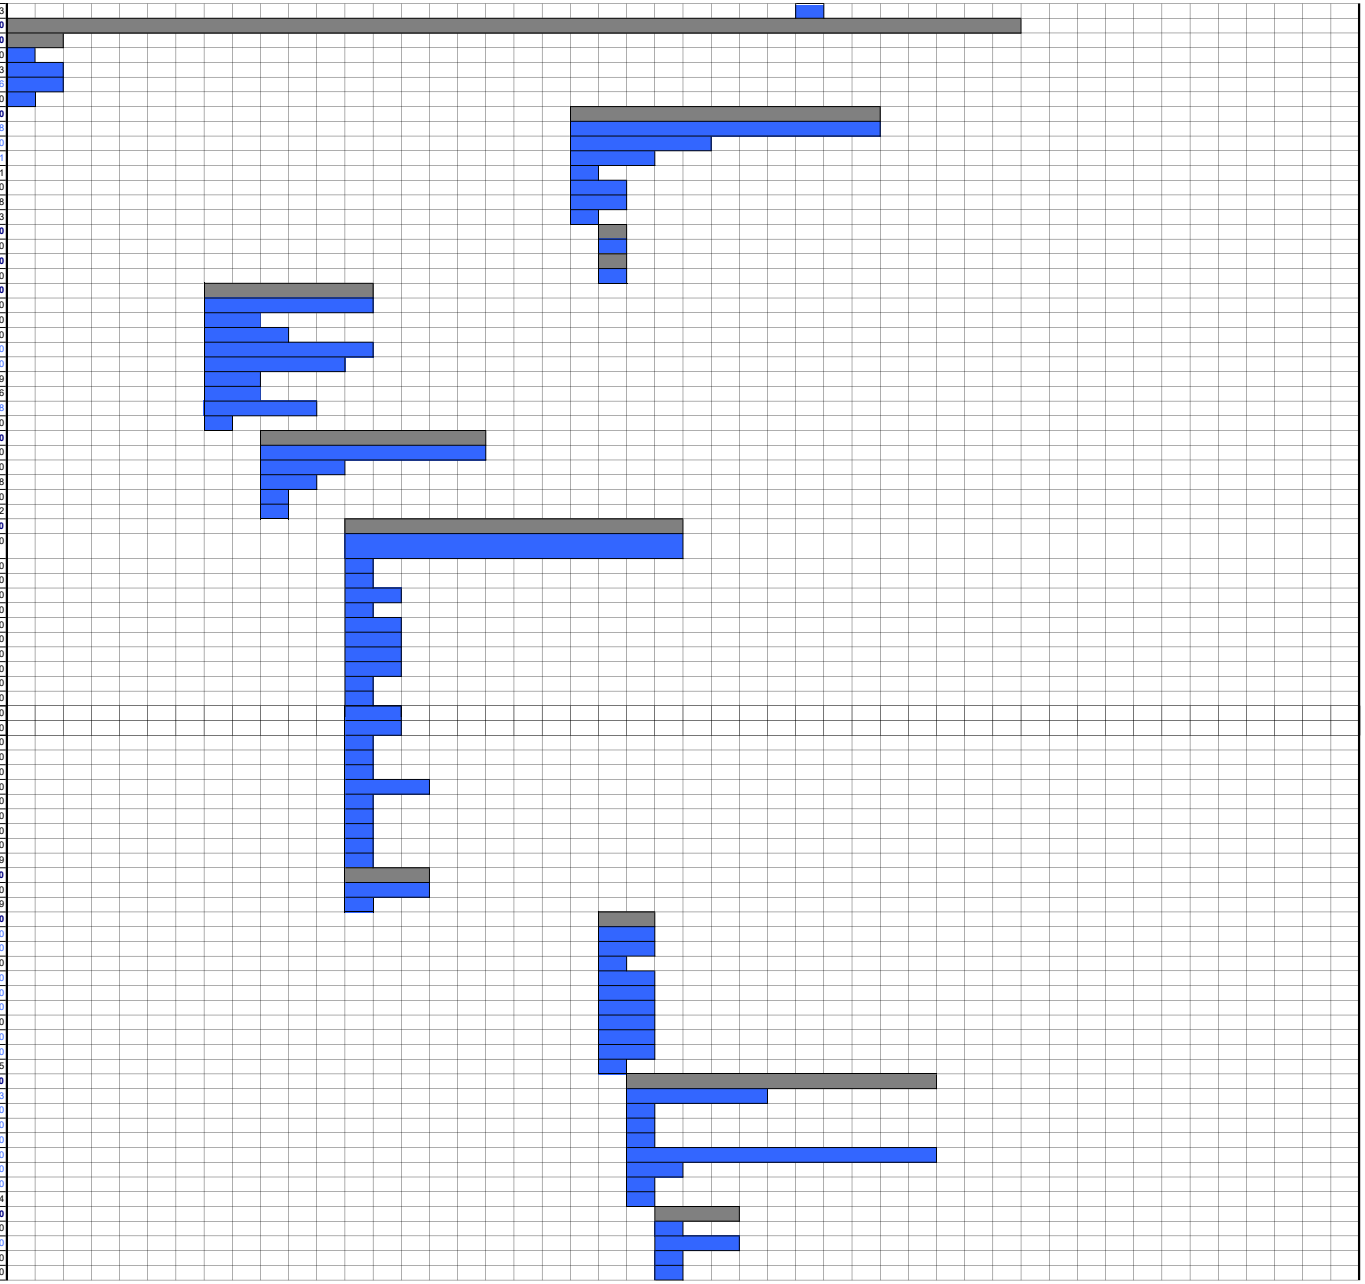


776	**Podlahy povlakové**		**21 445,59**	**0,000**
77629-0020	Montáž kovovej hrany na schodiskových stupňoch	m	130,40	30,800
77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	m	889,07	452,110
77651-1810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	13,69	5,900
77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	11 908,71	453,320
77657-2110	Voľné položenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	8 490,50	334,140
99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	13,22	0,769
781	**Obklady z obkladačiek a dosiek**		**10 990,52**	**0,000**
78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 300x200 do malty	m2	10 712,57	429,258
78148-9704	Prípl. za škárovanie škár. hmotou pri mont. obkl. keram.	m2	128,78	429,258
99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	149,17	29,833
783	**Nátery**		**5 212,13**	**0,000**
78378-2203	Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe	m2	3 640,11	1 820,056
78382-4120	Nátery betónových podláh dvojnásobné	m2	59,92	7,150
78389-4612	Náter podhľadov stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 2x	m2	1 512,10	630,040
784	**Maľby**		**2 714,97**	**0,000**
78445-3101	Maľby vnút. stropov dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach v. do 3.8	m2	468,54	347,070
78445-3111	Maľby vnút. stien dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach v. do 3.8	m2	2 246,43	1 797,143
D3	**PRÁCE A DODÁVKY M**		**0,00**	**0,000**
M21	**155 Elektromontáže**		**0,00**	**0,000**
21001-	Elektroinštalácie /vid diel ELI/ - samostatný rozpočet	sub	0,00	1,000
M24	**158 Montáž VZT zariadení a sušiarní**		**0,00**	**0,000**
24000-	Vzduchotechnika /vid diel VZT/ - samostatný rozpočet	sub	0,00	1,000
02	**SO 01 - Hlavný objekt - zdravotechnika**		**43 982,46**	**0,000**
HSV	**HSV**		**10 207,73**	**0,000**
1	**Zemné práce**		**4 644,32**	**0,000**
131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	461,70	54,000
131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,00	54,000
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2 239,02	106,620
132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	191,92	106,620
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	66,57	55,476
174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	1 127,32	118,044
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	530,79	24,360
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**		**5 256,00**	**0,000**
DM	Dodávka materiálu	sub	5 256,00	2,000
99	**Presun hmôt HSV**		**307,41**	**0,000**
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	307,41	35,954
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**33 774,73**	**0,000**
713	**Izolácie tepelné**		**2 107,77**	**0,000**
713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	1 254,35	533,000
713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	853,42	151,000
721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**		**5 134,65**	**0,000**
721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	480,00	40,000
721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	607,50	45,000
721172111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 125x2, 8	m	1 200,00	120,000
721172112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 160x3, 9	m	381,25	25,000
721173203	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	75,75	15,000
721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	105,00	20,000
721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	91,50	15,000
721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	73,64	28,000
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	55,29	19,000
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	90,30	21,000
721212305	Podlahový vpust s lievikom	ks	99,52	4,000
721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	277,02	27,000
721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	72,00	6,000
721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0	ks	96,00	6,000
721221128	Zápachová uzávierka pre kond.kotol	ks	12,50	1,000
721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	878,40	12,000
7212731451	Privzdušňovacia hlavica novodurová 110	ks	106,00	4,000
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	311,85	385,000
721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	25,75	25,000
998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,38	86,711
722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**		**15 167,34**	**0,000**
722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	188,25	15,000
722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	580,00	40,000
722190222	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb	159,26	2,000
722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb	102,89	1,000
722190224	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	súb	123,65	1,000
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	1 005,28	103,000
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1 279,35	95,000
722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	856,52	5,000
722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	súb.	420,00	2,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	239,40	684,000
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	307,80	684,000
733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	1 872,00	180,000
733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	2 499,00	210,000
733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	1 015,00	70,000
733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	881,60	58,000
722172631	Potrubie DN 40,0x5,5 v tyčiach	m	1 094,80	46,000
722172632	Potrubie DN 50,0x6,9 v tyčiach	m	1 477,80	45,000

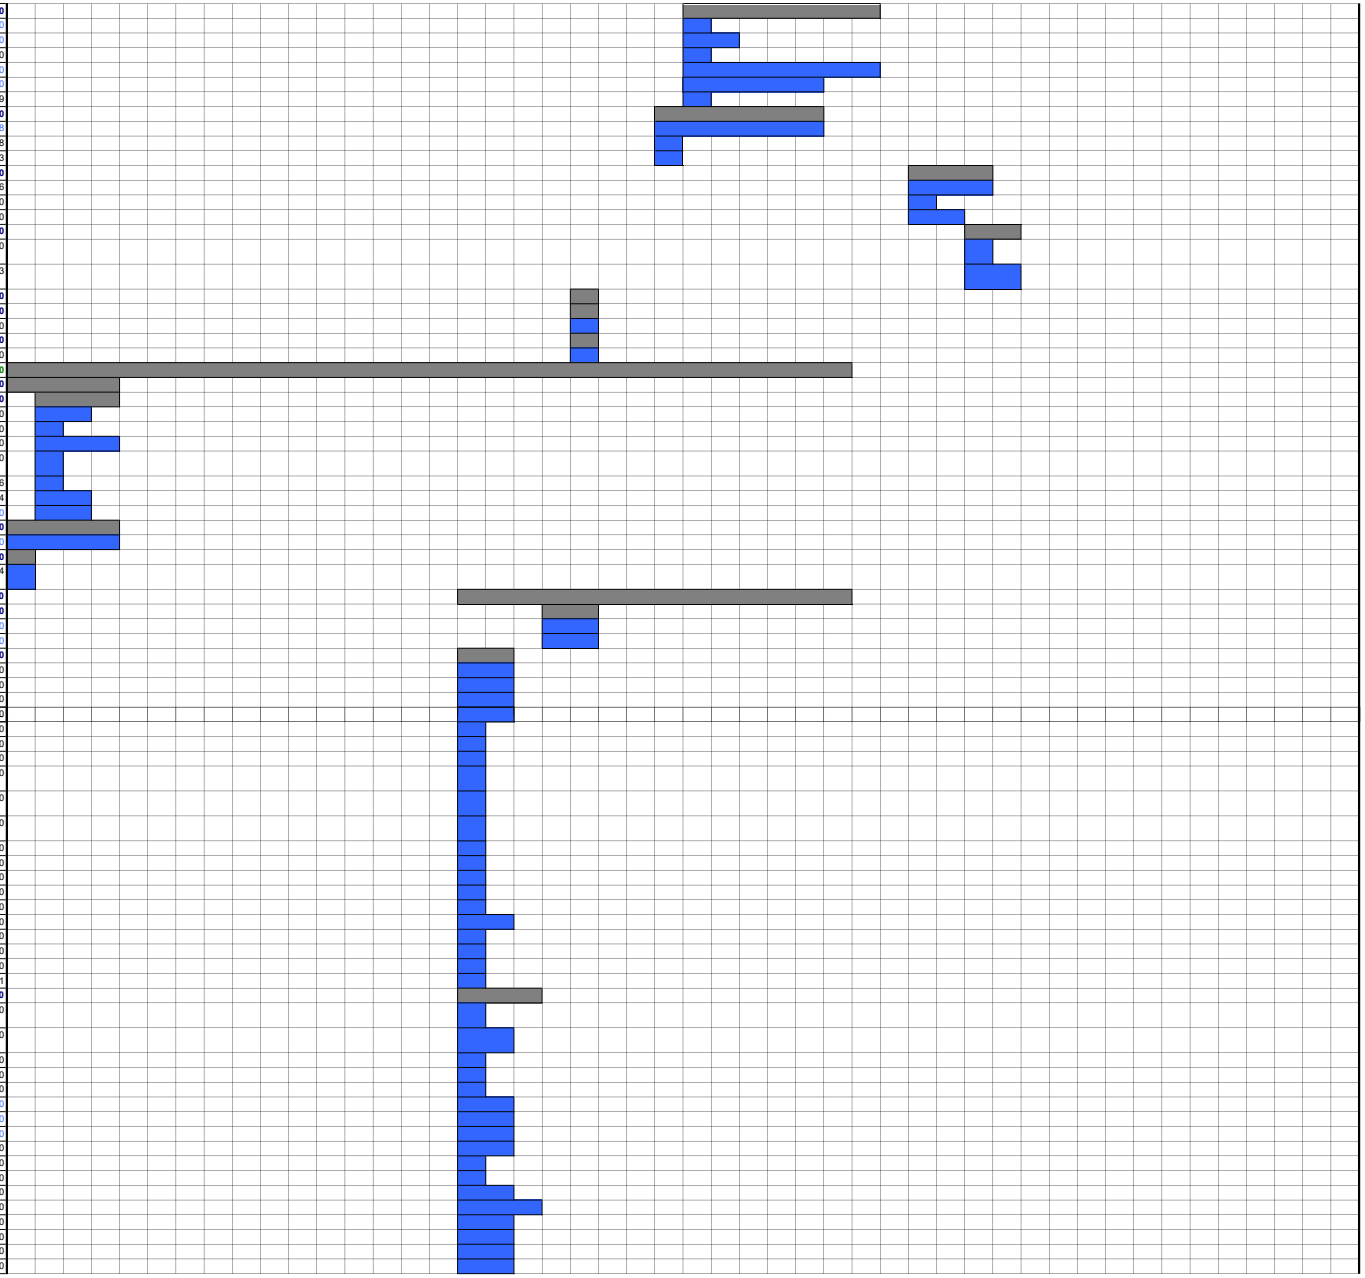


722172633	Potrubie DN 63,0x8,6 v tyčiach	m	971,00	20,000	
998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,74	187,478	
725	**Zdravotechnika - zariad. predmety**		**11 364,97**	**0,000**	
725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	1 953,00	21,000	
725119711	Montáž záchodov	súb	3 166,80	21,000	
725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1 815,50	27,000	
725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	688,20	6,000	
725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	1 200,00	6,000	
725319102	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu s použitím silikónového tmelu	súb	366,00	6,000	
725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	504,00	3,000	
725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	1 366,20	36,000	
725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	280,80	6,000	
998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,47	163,114	
03	**SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie**		**26 427,99**	**0,000**	
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**26 427,99**	**0,000**	
713	**Izolácie tepelné**		**5 366,90**	**0,000**	
713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	5 086,10	1 232,000	
713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	280,80	52,000	
731	**Ústredné kúrenie, kotolne**		**2 825,06**	**0,000**	
731241083	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	súb.	440,00	1,000	
73124108201	Uvedenie do prevádzky	súb	2 084,17	1,000	
73124108202	Montáž odvodu spalín	súb	218,15	1,000	
998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	82,74	25,074	
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**		**4 914,00**	**0,000**	
733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	1 840,00	1 150,000	
733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	150,00	12,000	
733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	387,50	25,000	
733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	625,50	45,000	
7331615051	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	1 222,00	52,000	
733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	492,80	1 232,000	
733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	26,00	52,000	
998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	170,20	170,197	
734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**		**3 671,58**	**0,000**	
734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	37,68	8,000	
734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	1 198,02	246,000	
734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	832,11	54,000	
734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	368,50	16,000	
734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	379,91	12,000	
734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	114,93	1,000	
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	474,78	41,000	
734411111	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	93,35	5,000	
734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	164,80	4,000	
998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,50	29,990	
735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**		**7 648,41**	**0,000**	
735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	1 705,25	14,000	
735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do	súb	4 210,20	27,000	
735311670	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine	ks	1 226,57	5,000	
735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	386,49	5,000	
998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	119,90	74,940	
732	**Ústredné kúrenie, strojovne**		**2 002,04**	**0,000**	
732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb.	1 417,76	1,000	
732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb.	77,33	1,000	
732331543	Expanzomat s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 18 l	súb.	71,55	1,000	
732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	435,40	2,000	
04	**SO 01 - Hlavný objekt - elektroinštalácia**		**18 129,28**	**0,000**	
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**2 509,02**	**0,000**	
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**		**2 509,02**	**0,000**	
953941711	Osadenie objímky alebo držiaka v murive tehlovom	ks	306,00	60,000	
971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	97,86	42,000	
973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm-otvor pre rozvádzač	ks	28,92	3,000	
973031616	Vysekanie kapsy pre kľatiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	114,24	102,000	
974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	1 962,00	900,000	
M	**Práce a dodávky M**		**15 153,26**	**0,000**	
21-M	**Elektromontáže**		**14 779,26**	**0,000**	
210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	108,60	30,000	
210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	186,12	99,000	
210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	138,72	51,000	
210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	40,08	8,000	
210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	188,00	200,000	
210021521	Tesnenie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky	ks	1 121,10	45,000	
210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	66,93	69,000	
210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	21,75	15,000	
210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	18,90	10,000	
210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	322,08	44,000	
210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	27,81	3,000	
210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia strieď.prep.- radenie 6	ks	25,44	2,000	
210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	25,98	2,000	
210110095	Spínače VCON6 pre rekuperačnú jednotku-montáž	ks	63,80	10,000	
210110501	Vypínač 40A na DIN lištu-doplnenie RM2	ks	19,69	1,000	

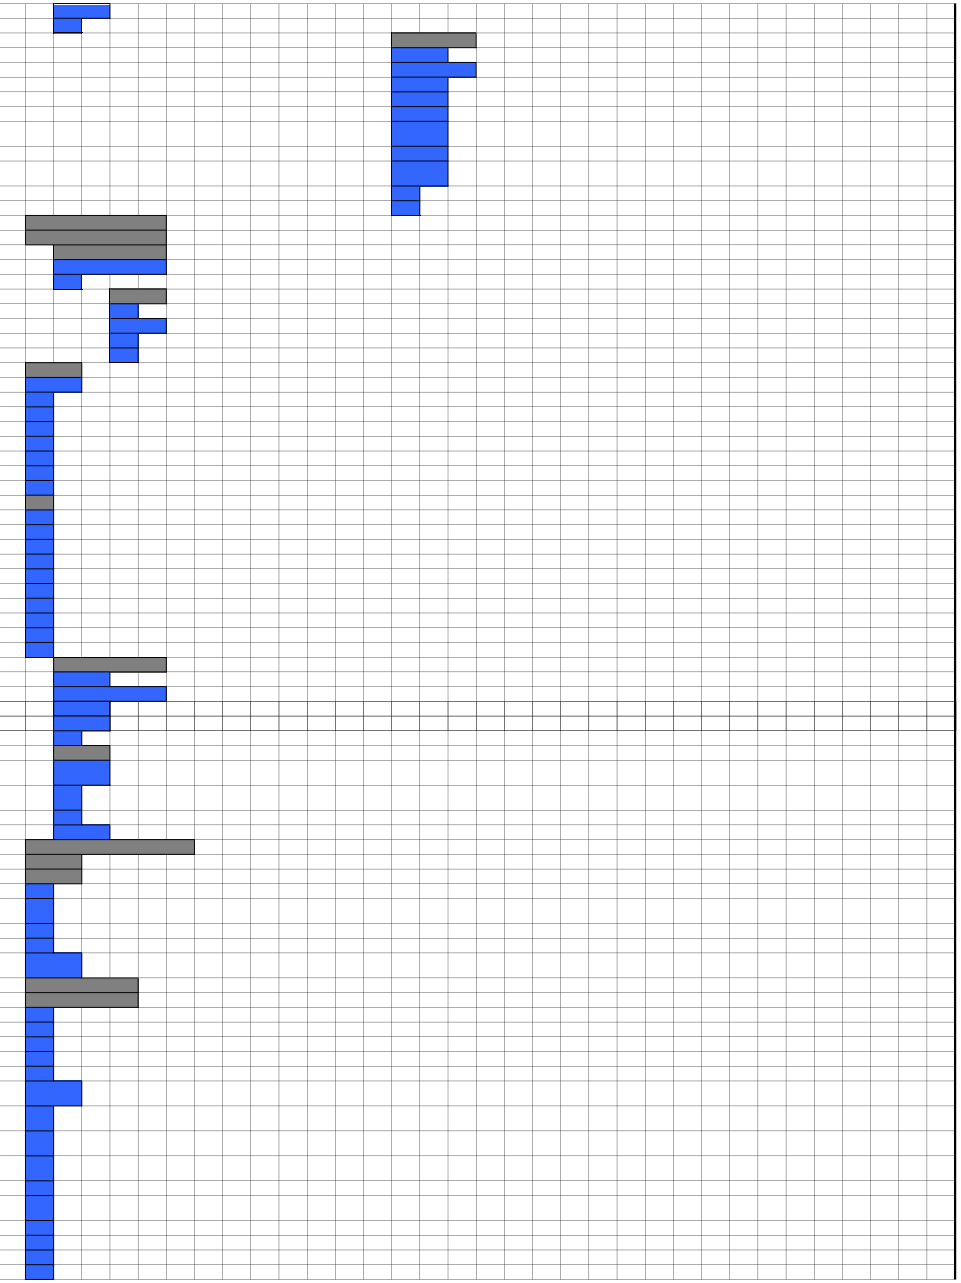

210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	292,50	39,000	
210111114	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	12,50	1,000	
210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A-dozbrojenie HR	ks	35,35	3,000	
210201220	Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou-typ LV	ks	58,01	1,000	
210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie-doplnenie HR	ks	172,66	1,000	
210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1 376,72	3,000	
210201001	Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, nástenného interierového so žiarovkou-typ F	ks	155,24	4,000	
210201002	Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného interierového so žiarovkou-typ	ks	1 025,50	35,000	
210201005	Zapojenie svietidlá IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou s pohyb.senzorom-typ I	ks	648,84	12,000	
210201015	Zapojenie svietidlá IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou-typ G	ks	159,30	6,000	
210201041	Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=36W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou-typ B	ks	4 739,25	75,000	
210201220	Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou-typ LV	ks	27,40	1,000	
210201520	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim-typ D	ks	210,65	5,000	
210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	65,36	2,000	
210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	26,32	8,000	
210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	30,80	8,000	
210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	55,20	16,000	
210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	516,44	190,000	
210220811	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	366,52	98,000	
210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	17,90	1,000	
210220840	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	ks	11,82	1,000	
210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	3,83	1,000	
210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	148,32	48,000	
210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	46,00	8,000	
210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	20,80	20,000	
210800072	Vodič medený uložený pod omietkou 450/750 V 3x1,5mm2	m	933,12	729,000	
210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	477,36	78,000	
210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	386,40	230,000	
210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	23,70	10,000	
210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	53,92	16,000	
210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	159,46	34,000	
210881270	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV	m	147,07	61,000	
22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**		**374,00**	**0,000**	
220300921	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 1 pólová	ks	374,00	200,000	
HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**		**467,00**	**0,000**	
HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-úprava rozv.RM2	hod	229,00	20,000	
HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	238,00	14,000	
05	**SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia**		**12 009,19**	**0,000**	
D1	**Zariadenie č.1 – Odvetranie hygienických zariadení**		**1 713,35**	**0,000**	
Pol3	Stropný resp. stenový radiálny ventilátor napr.MICRO 100 T	ks	483,00	6,000	
Pol4	Stropný resp. stenový napr. MEDIO T	ks	233,20	2,000	
Pol5	**Stropný resp. stenový napr.SUPER T**	**ks**	**152,30**	**1,000**	
Pol6	Kruhová strieška KS 125 - 2	ks	11,50	1,000	
Pol7	Kruhová strieška KS 100 - 2	ks	20,60	2,000	
Pol8	Dverová mriežka obojstranná napr.NOVA-D-1-525x125-UR1	ks	24,97	1,000	
Pol9	Dverová mriežka obojstranná napr.NOVA-D-1-325x125-UR1	ks	150,88	8,000	
Pol10	Vonkajšia krycia mriežka C-UM-Z-S-166x166	ks	2,50	1,000	
Pol11	Ohybná hadica napr.ALUVAC, 102	bm	18,00	15,000	
Pol12	Kruhové potrubie napr.SPIRO do priemeru O 125 mm	bm	126,00	30,000	
Pol13	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	36,40	7,000	
Pol14	tvarovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	59,00	10,000	
Pol15	Samolepiaca kaučuková izolácia napr.Armaflex s hliníkovou povrchovou úpravou hr. 13mm (izolovať rozvody vedené v krove)	m2	76,00	8,000	
Pol16	Montážny, tesniaci a spájací materiál	kpl	75,00	1,000	
Pol17	MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním 30% z ceny dodávky	kpl	244,00	1,000	
D2	**Zariadenie č.2 – Odvetranie zázemia kuchyne**		**764,24**	**0,000**	
Pol18	Potrubný radiálny ventilátor CK 200B	ks	111,80	1,000	
Pol19	Regulátor otáčok R10	ks	29,80	1,000	
Pol20	Spojovacia manžeta MK 200	ks	8,60	2,000	
Pol21	Samočinná žalúzia WSK 20	ks	28,60	1,000	
Pol22	Kruhový tlmič hluku rúrový SPT-GLX 200/1000	ks	65,10	1,000	
Pol8	Dverová mriežka obojstranná napr.NOVA-D-1-525x125-UR1	ks	49,94	2,000	
Pol23	Kovový odvodný tanierový ventil DVS 160	ks	14,60	2,000	
Pol24	Kovový odvodný tanierový ventil DVS 125	ks	14,40	3,000	
Pol25	Kovový odvodný tanierový ventil DVS 100	ks	4,20	1,000	
Pol11	Ohybná hadica napr.ALUVAC, 102	bm	3,60	3,000	
Pol26	Ohybná hadica napr.ALUVAC, 127	bm	4,50	3,000	
Pol27	Kruhové potrubie napr.SPIRO O 200 mm	bm	35,50	5,000	
Pol28	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	13,60	2,000	
Pol29	tvarovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	18,20	2,000	
Pol30	Kruhové potrubie napr.SPIRO O 160 mm	bm	48,60	9,000	
Pol31	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	ks	15,20	4,000	
Pol32	tvarovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	38,00	5,000	
Pol33	Montážny, tesniaci a spájací materiál	kpl	50,00	1,000	
Pol34	MONTÁŽ zariadenia č.2 - porovnaním 25% z ceny dodávky	kpl	210,00	1,000	
D3	**Zariadenie č.3 – Rekuperačné vetranie miestností**		**9 531,60**	**0,000**	
Pol35	Stenová rekuperačná jednotka so spätným získavaním tepla HR 300	ks	6 356,00	14,000	
Pol36	Predlžovací nástavec EXT 300	ks	1 071,00	14,000	
Pol37	Nástenný ovládač VCON6	ks	1 268,40	14,000	
Pol38	Prepojovací kábel medzi jednotkou a ovládačom	bm	144,00	120,000	

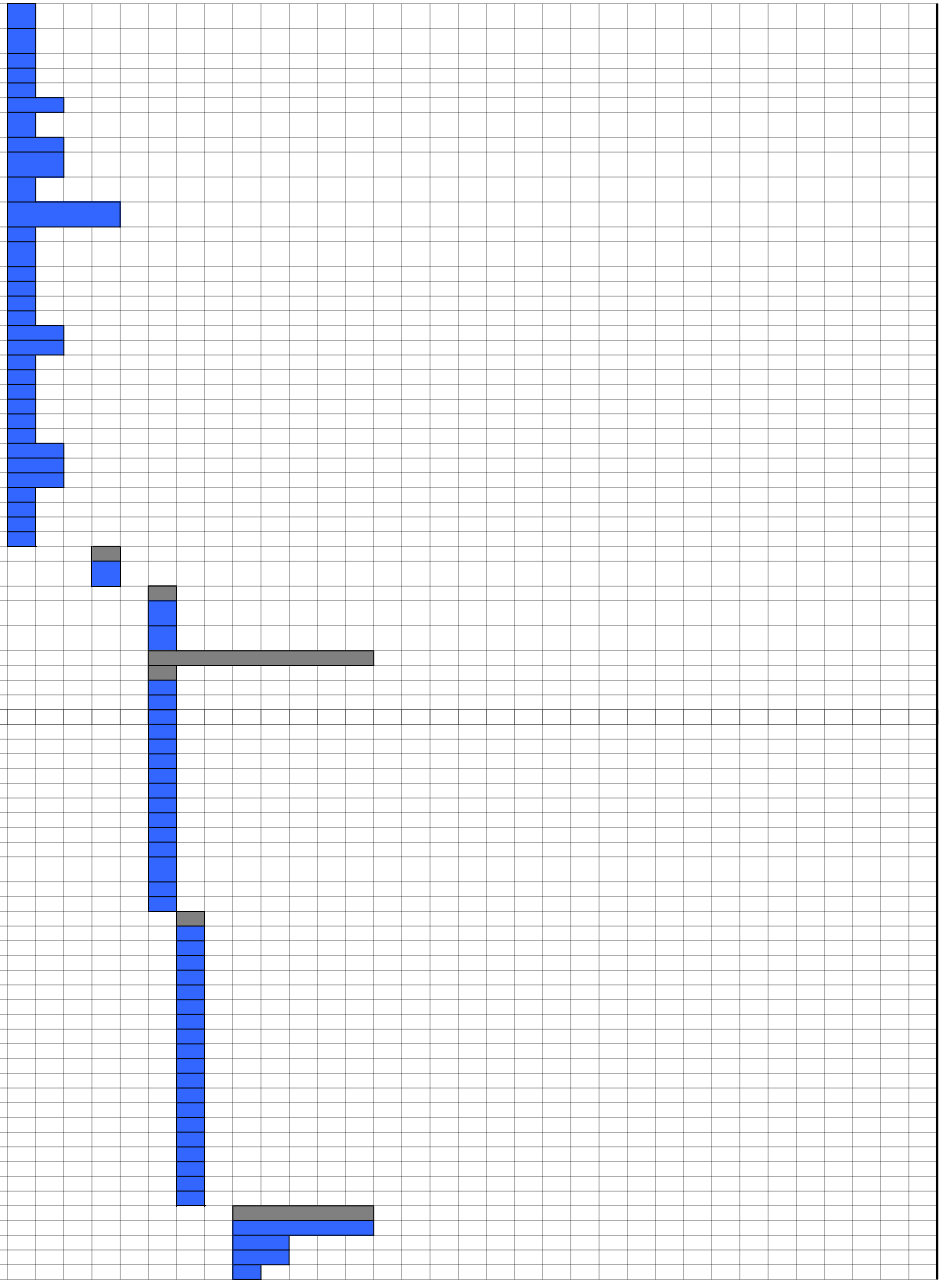

Pol39	MONTÁŽ zariadenia č.3 - porovnaním 20% z ceny dodávky	kpl	692,20	1,000
06	**SO 02 - Spevnené plochy**		**14 318,01**	**0,000**
D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**		**14 318,01**	**0,000**
1	**ZEMNE PRÁCE**		**2 031,20**	**0,000**
12110-1104	Odstránenie ornice s premiestnením do 500 m	m3	117,00	65,000
12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	478,89	93,900
12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	14,09	28,170
16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	122,07	93,900
18040-2111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m2	712,65	1 150,000
18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	207,00	1 150,000
18130-1111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	m2	287,50	1 150,000
18340-3151	Obrobenie pôdy spúšťaním v rovine	m2	34,50	1 150,000
18340-3152	Obrobenie pôdy vláčením v rovine	m2	34,50	1 150,000
18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	23,00	1 150,000
2	**ZÁKLADY**		**118,25**	**0,000**
28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m2	118,25	110,000
5	**KOMUNIKÁCIE**		**10 280,15**	**0,000**
56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy zhutn. na 45 MPa	m2	110,00	110,000
56420-1101	Riečny štrk fr. 4-8 mm hr. 40 mm	m2	1 980,00	110,000
56425-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 16-32 mm hr. 150 mm	m2	792,00	220,000
56427-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm hr. 250 mm vibr.	m2	1 128,75	215,000
56486-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	m2	1 064,25	215,000
56514-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom OK1, š. do 3 m hr. 60 mm	m2	2 709,00	215,000
57714-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	2 496,15	215,000
9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**		**1 888,41**	**0,000**
91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 193,75	125,000
91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	335,76	44,000
99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	358,90	358,895
07	**SO 03 - Oplotenie**		**5 848,59**	**0,000**
D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**		**2 513,51**	**0,000**
1	**ZEMNE PRÁCE**		**94,35**	**0,000**
13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	37,58	4,421
13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	1,06	1,326
16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	26,53	4,421
17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	2,65	4,421
97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	26,53	4,421
2	**ZÁKLADY**		**397,89**	**0,000**
27531-3612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	397,89	4,421
3	**ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**		**1 924,56**	**0,000**
33817-1121	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC	kus	902,00	44,000
34812-1121	Osadenie plotových panelov 250/35/2350 mm	kus	1 022,56	44,000
9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**		**96,71**	**0,000**
99815-1111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	t	96,71	13,816
D2	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**		**3 335,08**	**0,000**
767	**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**		**3 335,08**	**0,000**
76791-4130	Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m	m	3 107,00	110,000
76792-0210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	kus	213,00	1,000
99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	15,08	0,754
08	**SO 04 - Úprava jestvujúcej kanalizácie**		**1 009,20**	**0,000**
HSV	**HSV**		**809,20**	**0,000**
8	**Rúrové vedenie**		**809,20**	**0,000**
DM	Dodávka materiálu	ks	460,00	2,000
899311111	Osadenie oceľ.alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	349,20	2,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**200,00**	**0,000**
721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**		**200,00**	**0,000**
721172112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 160x3, 9	m	200,00	5,000
09	**SO 05 - Exteriérové hracie plochy**		**5 816,48**	**0,000**
D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**		**5 816,48**	**0,000**
1	**ZEMNE PRÁCE**		**71,31**	**0,000**
13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	28,31	2,600
13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	0,67	0,780
16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	15,94	2,600
17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,87	2,600
97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	24,52	2,600
2	**ZÁKLADY**		**223,76**	**0,000**
27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	m3	223,76	2,600
3	**ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**		**5 396,59**	**0,000**
34912-1001	Montáž zariadení drobnej architektúry do 1,5 t	kus	5 396,59	7,000
9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**		**124,82**	**0,000**
99815-1111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	t	124,82	6,535

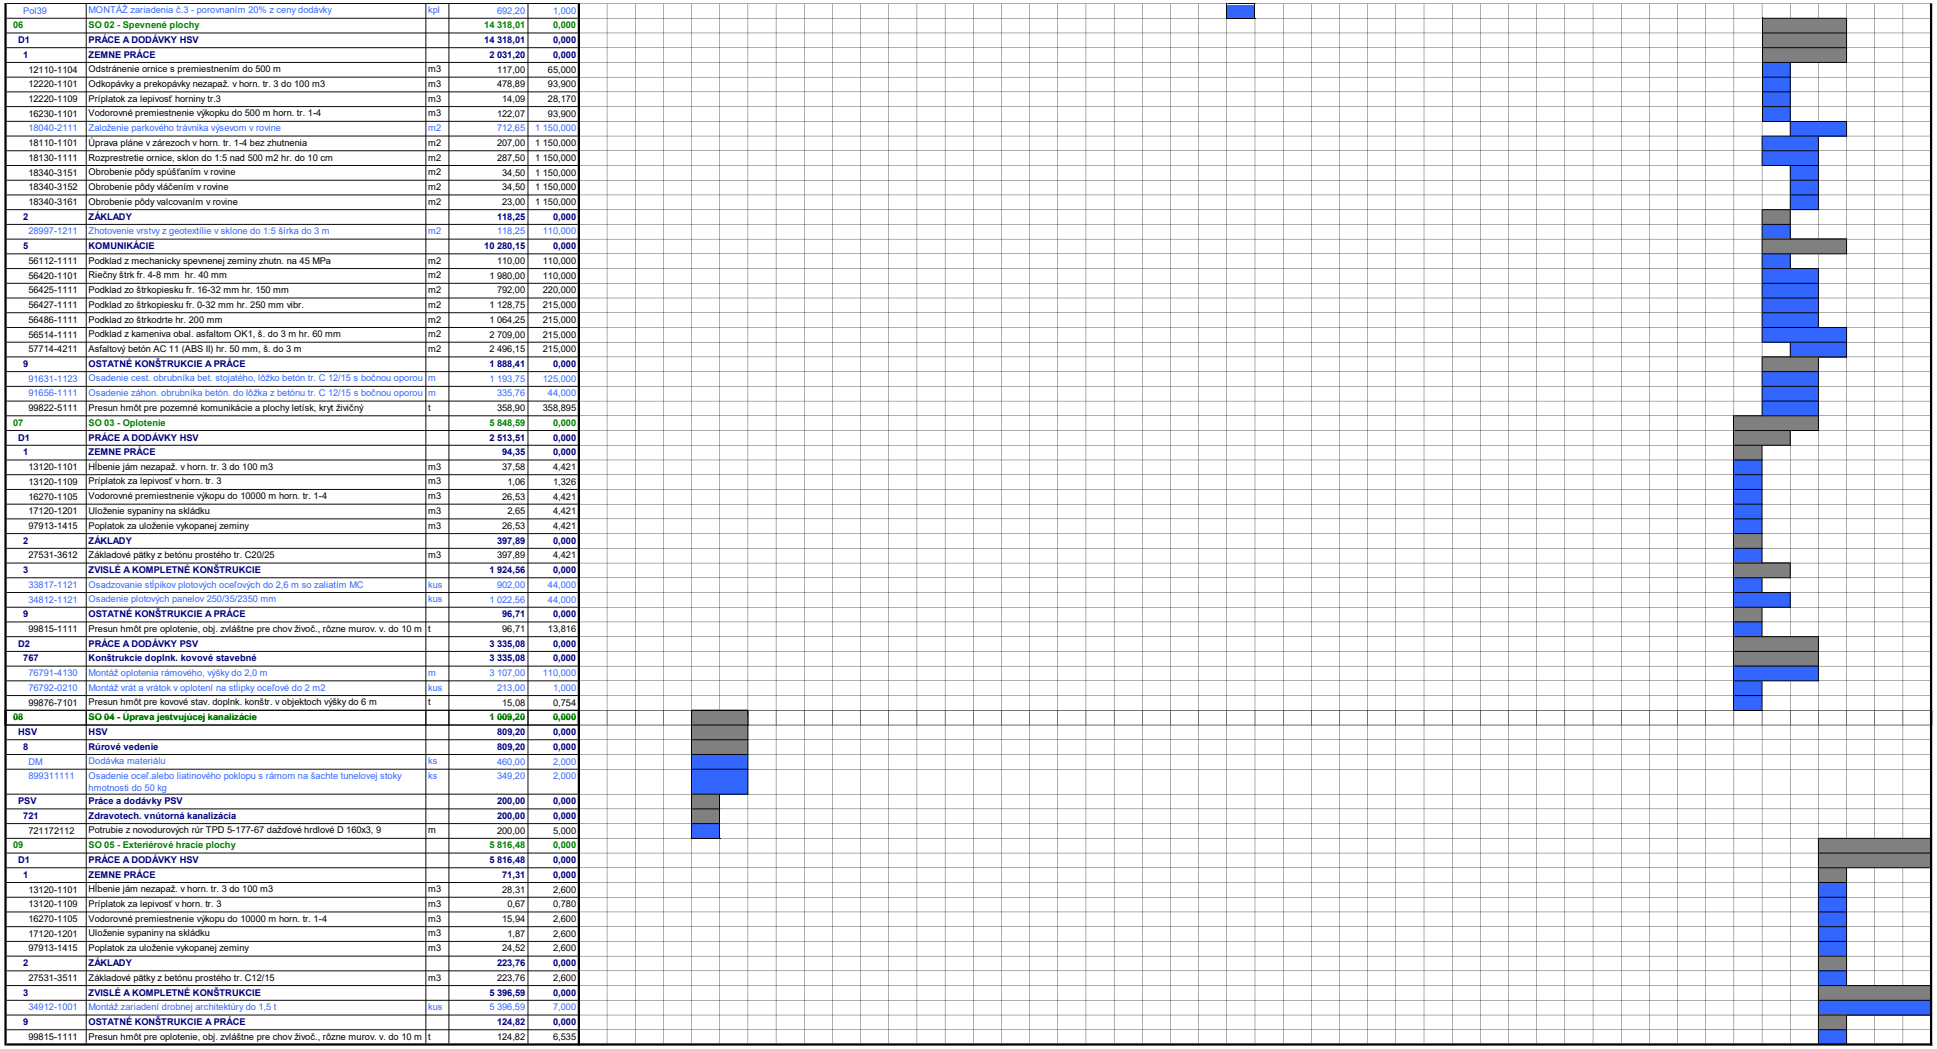

Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti NOVICOM s.r.o.

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	**Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice**
Názov predmetu zákazky	**Výstavba materskej školy v obci Kuzmice**

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	**NOVICOM s.r.o.**
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	**Slivník 61, 076 12 Slivník**

~~**a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)**~~

alebo

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v 9,31 % t.j. 44 253,66 € bez DPH

Navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO Subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky Vecne	% plnenia zo zákazky
EUREX, s.r.o.	**Ruskovská 6, 075 01 Trebišov**	**36184063**	**Milan Novák**	**SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie**	**5,56**
KLIVENT s.r.o.	**Slanec 387, 044 17 Slanec**	**45259046**	**Mgr. Matúš Tomko**	**SO 01 Hlavný objekt - klimatizácia**	**2,53**
PLAYSYSTEM s.r.o	**Rampová 4, 04001 Košice**	**36601411**	**Viktória Lišková**	**SO 05 - Exteriérové hracie plochy**	**1,22**

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Slivníku, dňa 26.05.2021

.....

Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
